

Ohjelmistotuotanto

Luento 4

22.3.

Vaatimusmäärittely ketterässä prosessimallissa  
nopea kertaus


# Nopea kertaus eilisestä

- User story
  - ”Määritelmä”: CCC (card, conversation, confirmation)
  - INVEST
- Estimointi
  - Miksi?
  - Miten?
  - Kuka?
- Product Backlog
  - Kuka vastuussa?
  - Miten saadaan projektin alussa muodostettua?

# Hyvä product backlog on DEEP

- <http://www.romanpichler.com/blog/product-backlog/making-the-product-backlog-deep/>
- Mike Cohn lanseerasi lyhenteen DEEP kuvaamaan hyvän backlogin ominaisuuksia
  - **Detailed** appropriately
  - **Estimated**
  - **Emergent**
  - **Prioritized**
- **Detailed** appropriately eli sopivan detaljoitu:
  - Backlogin prioriteeteiltaan korkeimpien eli pian toteutettavaksi otettavien User Storyjen kannattaa olla suhteellisen pieniä ja näin tarkemmin estimoituja
  - Alemman prioriteetin User Storyt voivat vielä olla isompia ja karkeammin estimoituja

# Hyvä product backlog on DEEP

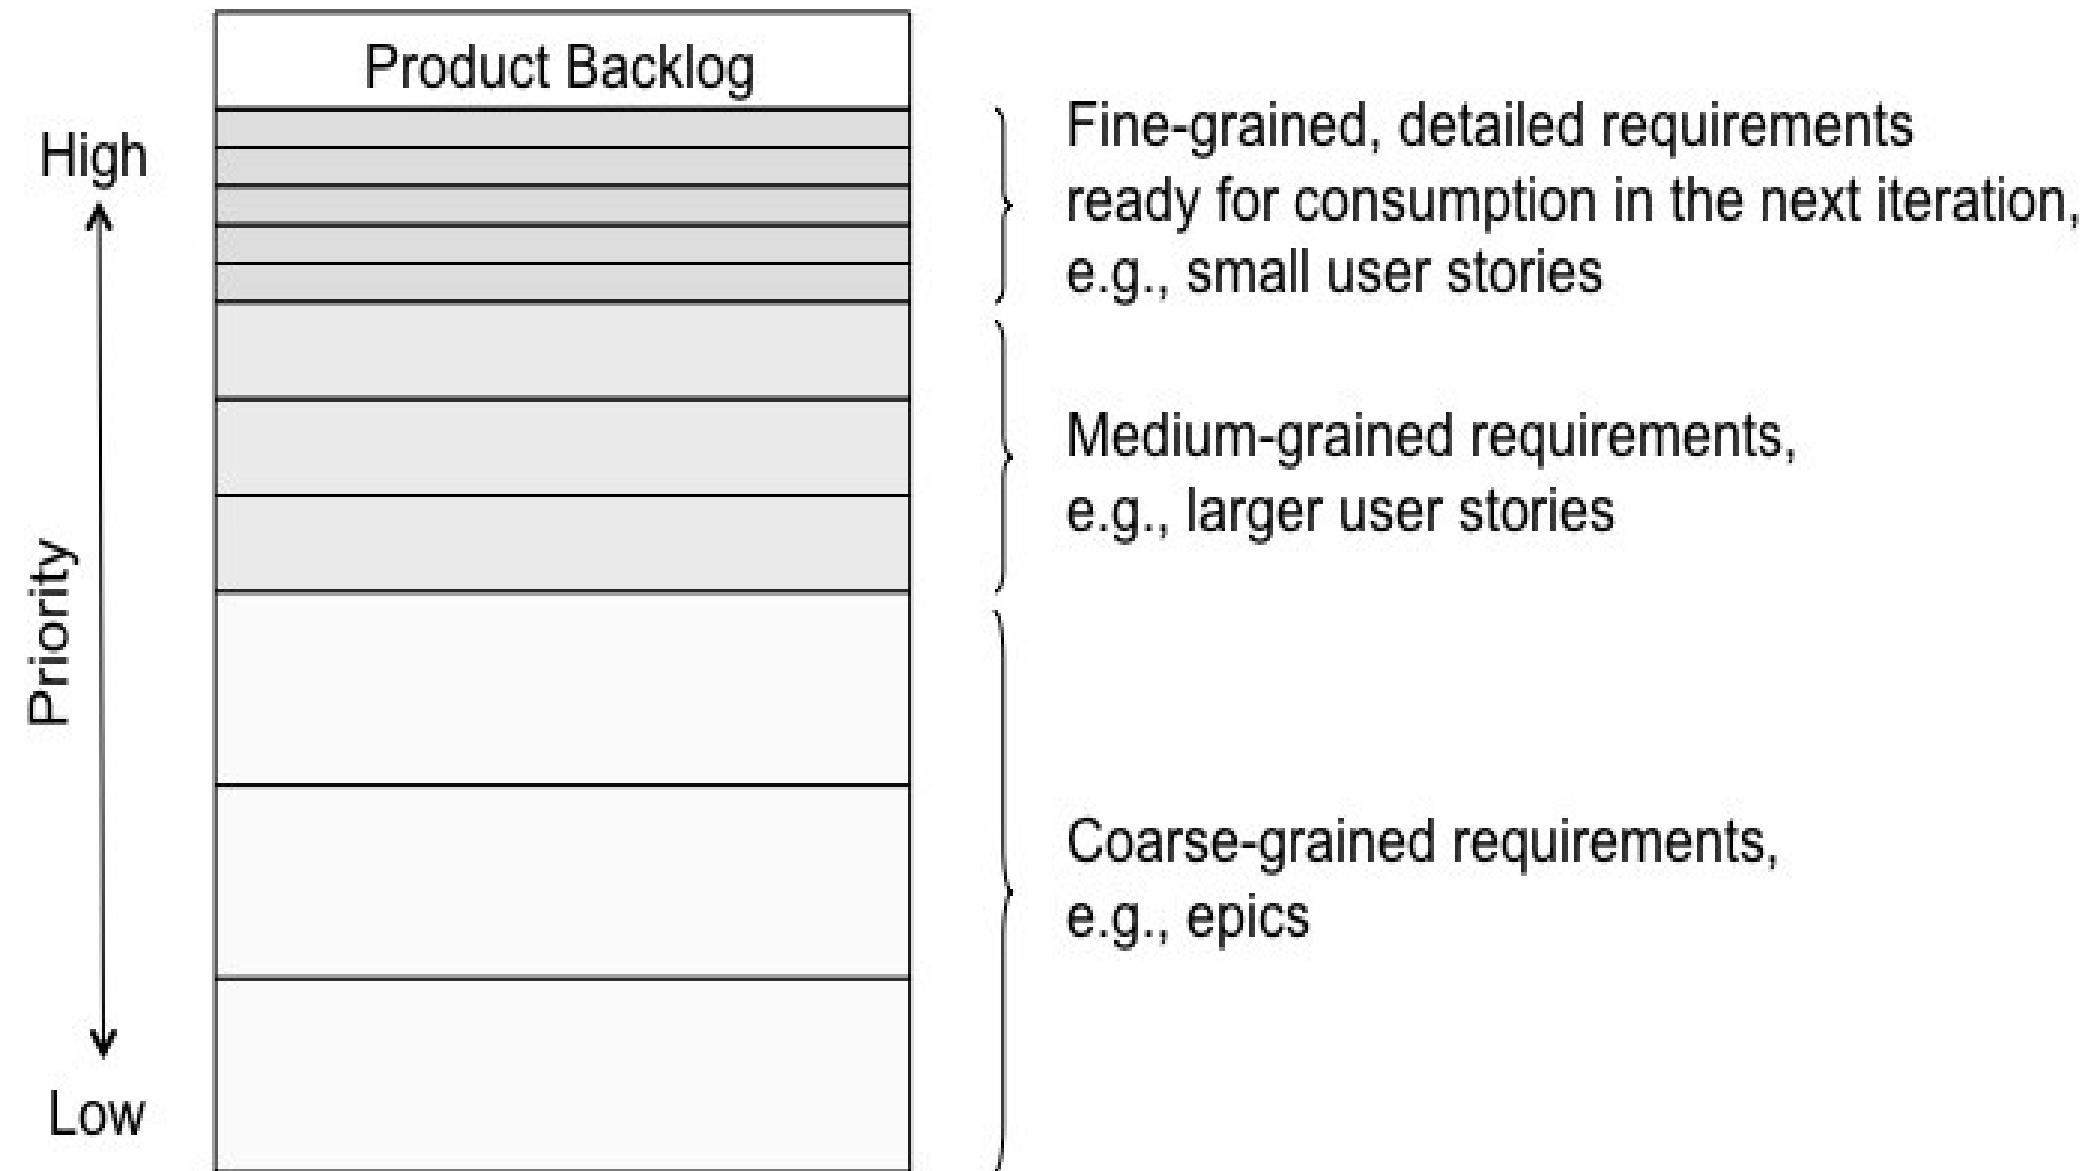

# Hyvä product backlog on DEEP

- DEEP ominaisuuksista **estimated** ja **prioritized** ovat meille tuttuja
- **Emergent** kuvaa backlogin muuttuvaa luonnetta:
  - The product backlog has an organic quality. It evolves, and its contents change frequently. New items emerge based on customer and user feedback, and they are added to the product backlog. Existing items are modified, reprioritized, refined, or removed on an ongoing basis.
- Muuttuvan luonteensta takia backlogia tulee hoitaa (**backlog grooming**) projektin edetessä
  - Backlogiin lisätään uusia User storyja ja vanhoja tarpeettomaksi käyneitä poistetaan
  - Isoja User storyja pilkotaan tarpeentullen pienemmiksi (erityisesti prioriteetin kasvaessa täytyy isot Storyt pilkkoa pienemmiksi)
  - Backlogiin lisättäviä uusia User storyjä estimoidaan ja vanhojen Storyjen estimaatteja tarkastetaan ymmärryksen kasvaessa
  - Backlogin hoitamiseen osallistuu koko ohjelmistotuotantotiimi, pääasiallinen vastuu on Product Ownerilla
- <http://www.romanpichler.com/blog/product-backlog/grooming-the-product-backlog/>

# Julkaisun suunnittelu – release planning


- Estimoinnin toinen tarkoitus on, että se **mahdollistaa koko projektin viemän aikamäärän summittaisen arvioinnin** eli julkaisun suunnittelun (engl. release planning)
- Jos estimoinnin yksikkönä kuitenkin on abstrakti käsite Story point, miten estimaattien avulla on mahdollista arvioida projektin viemää aikamäärää?
- Kehitystiimin **velositeetti** (engl velocity) tarjoaa osittaisen ratkaisun tähän
- Velositeetillä tarkoitetaan Story pointien määrää, minkä verran tiimi pystyy keskimäärin toteuttamaan yhden sprintin aikana
- Jos tiimin velositeetti on selvillä ja projektissa toteutettavaksi tarkoitetyt User storyt on estimoitu, on helppo tehdä alustava arvio projektin viemästä aikamäärästä

(User storyjen estimaattien summa) / velositeetti \* sprintin pituus

- Projektin alkaessa velositeetti ei yleensä ole selvillä, ellei kyseessä ole jo yhdessä työskennellyt tiimi
- On kehitetty tapoja joiden avulla velositeetti voidaan yrittää ennustaa
  - Hyvin epäluotettavia, emme käsittele niitä nyt


# Velositeetti

- Velositeetti vaihtelee tyypillisesti alussa melko paljon ja alkaa stabiloitumaan vasta muutaman sprintin päästä
  - Estimointi on aluksi vaikeampaa varsinkin jos sovellusalue ja käytetyt teknologiat eivät ole täysin tuttuja
- Projektin kestoarvio alkaakin tarkentumaan pikkuhiljaa

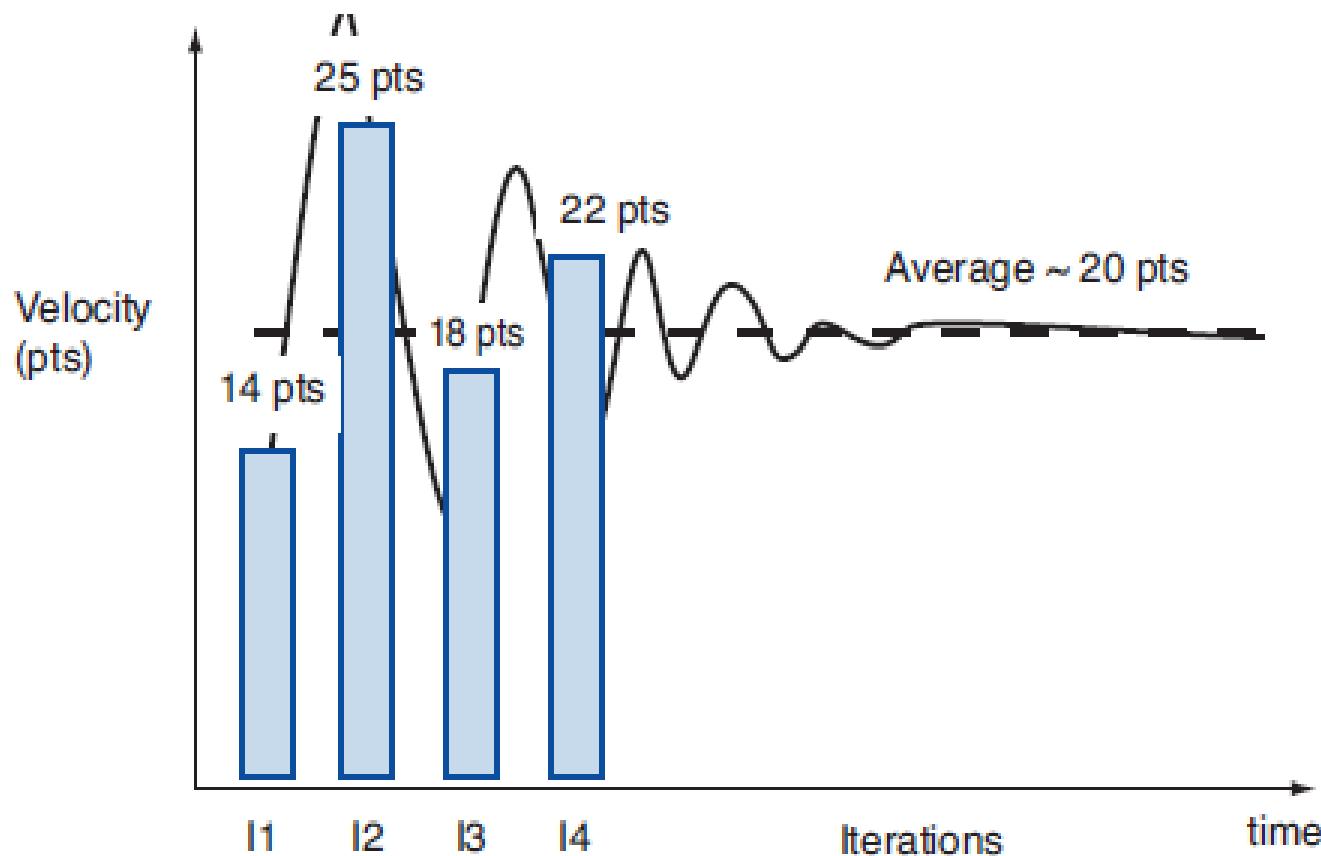


- Ketterissä menetelmissä on oleellista kuvata mahdollisimman realistisesti projektin etenemistä
- Tämän takia velositeettiin lasketaan mukaan ainoastaan **täysin valmiaksi** (eli Definition of Doneen mukaisesti) toteutettujen User storyjen Story pointit
  - "lähes valmiaksi" tehtyä työtä ei siis katsota ollenkaan tehdyksi työksi
  - [http://jamesshore.com/Agile-Book/done\\_done.html](http://jamesshore.com/Agile-Book/done_done.html)

Beginning of sprint

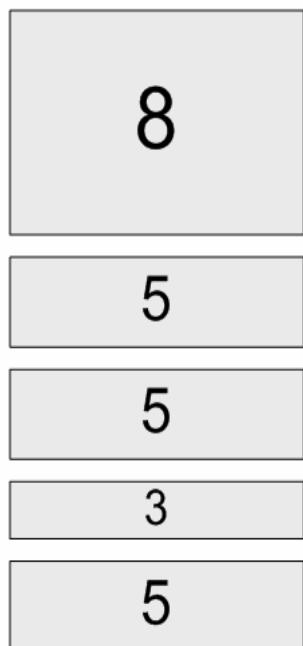

Estimated  
velocity = 26


End of sprint

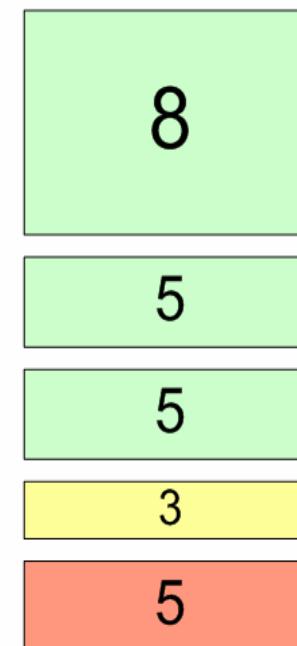

Actual  
velocity = 18

# Julkaisun suunnittelu – release planning


- Ketterän projektin etenemistä kuvataan yleensä Release Burndown -kaavion avulla
  - Aika etenee x-akselissa sprintti kerrallaan
  - y-akselilla on **jäljellä olevan työn määrä** Story pointeina mitattuna

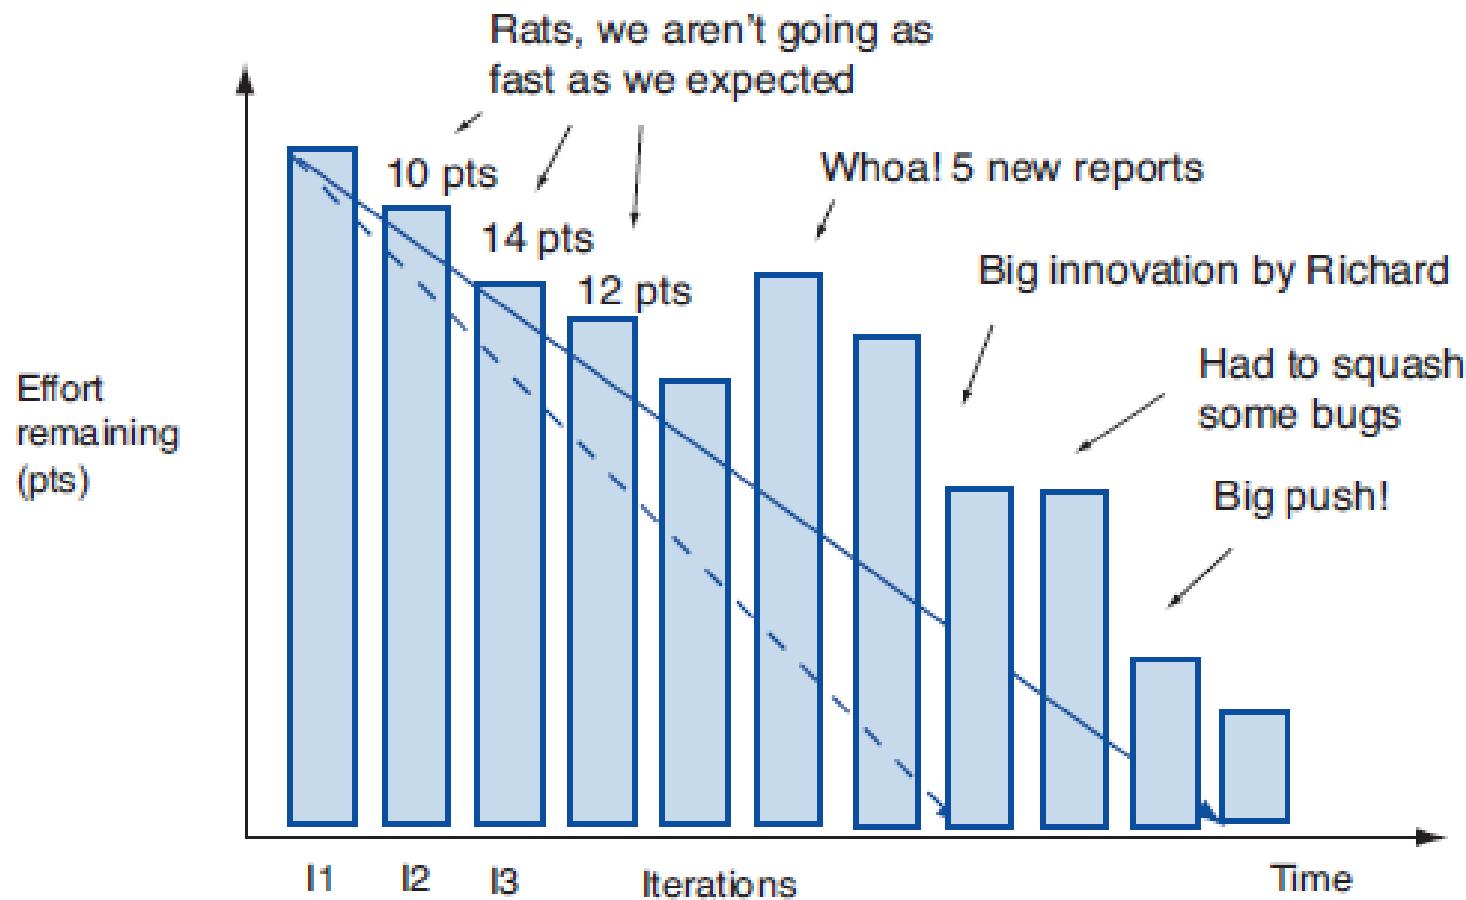

- Ketterässä projektissa vaatimukset saattavat muuttua kehitystyön aikana, siksi jäljellä olevan työn määrä ei aina vähene

# Julkaisun suunnittelu – release planning

- Joskus käytetäänkin Burn Up -kaavioita joka tuo selkeämmin esiin kesken projektin etenemisen tapahtuvan työmääärän kasvun

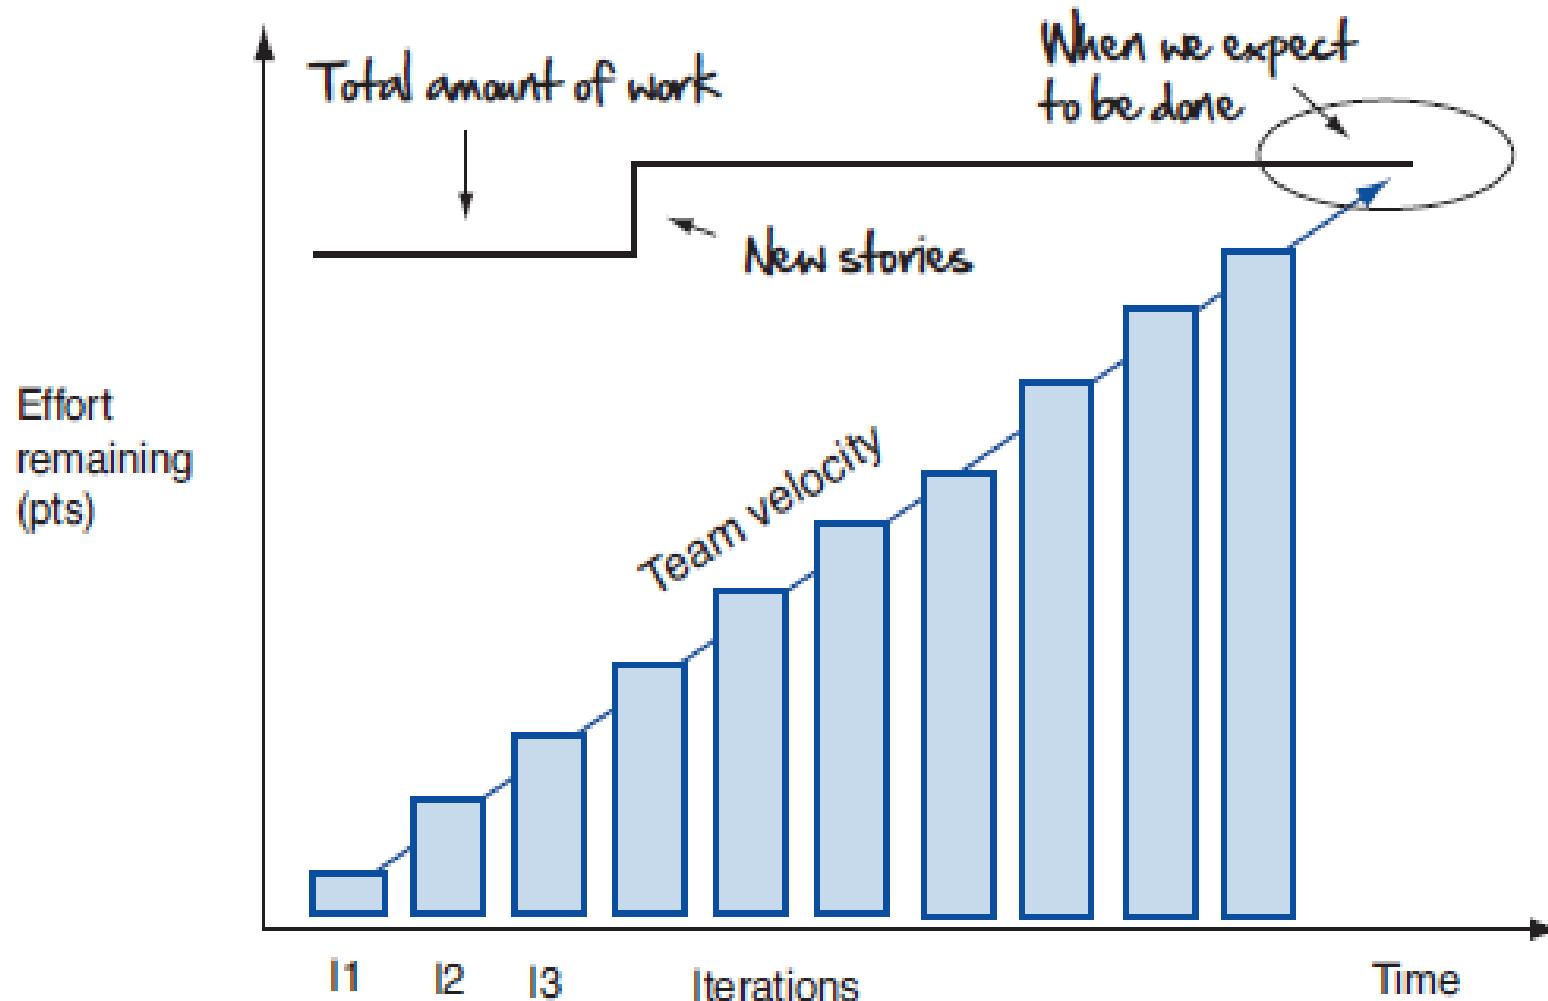

# Sprintin suunnittelu

# Sprintin/iteraation suunnittelu

- Kertauksena viime viikolta: Scrum määrittelee pidettäväksi ennen jokaista sprinttiä kaksiosaisen suunnittelupalaverin
- Ensimmäisen osan tarkoitus on selvittää **mitä sprintin aikana tehdään**
  - Product Owner esittelee Product backlogin kärjessä olevat vaatimukset
  - Tiimin on tarkoitus olla riittävällä tasolla selvillä mitä vaatimuksilla tarkoitetaan
  - Tiimi sitoutuu niin moneen Backlogin vaatimukseen kuin se arvioi kykenevänsä sprintin aikana toteuttamaan
- Sprintin aikana toteutettavien vaatimusten lisäksi asetetaan sprintin tavoite
- Suunnittelukokouksen toisen osan aikana selvitetään **miten sprintin tavoitteet saavutetaan**
  - Toisen osan aikana tiimi suunnittelee toteutettavaksi valitut vaatimukset tarvittavalla tasolla
  - Tarkennetaan nyt Sprintin suunnittelun ja läpivientiin liittyviä asioita
    - Lähteenä Kniberg Scrum and XP From the Trenches, luvut 3-6

# Sprintin suunnittelu


- Suunnittelun osallistuu Product Owner ja kehittäjät
- Lähtökohtana on sopivassa tilassa oleva eli DEEP Product backlog
  - Priorisoitu ja estimoitu
  - Korkeimman prioriteetin omaavat User storyt tarpeeksi pieniä ja Product Ownerin hyvin ymmärtämiä
- Suunnittelun yhteydessä määritellään **sprintin tavoite** (sprint goal)
  - Tavoite on jotain geneerisempää kuin yksittäisten backlogissa olevien User storyjen toteuttaminen
- Scrumin kehittäjä Ken Schwaber mainitsee 2002 kirjoitetussa kirjassaan asettavansa usein ensimmäisen sprintin tavoitteeksi: *"demonstrate a key piece of user functionality on the selected technology"*
- Seuraavalla sivulla Mike Cohnin määritelmä sprintin tavoitteesta

# Sprintin tavoite [Mike Cohn]

- A sprint goal is a short, one- or two-sentence, description of what the team plans to achieve during the sprint
- It is written collaboratively by the team and the product owner
- The following are typical sprint goals on an eCommerce application:
  - Implement basic shopping cart functionality including add, remove, and update quantities
  - The checkout process—pay for an order, pick shipping, order gift wrapping, etc.
- The sprint goal can be used for quick reporting to those outside the sprint
  - There are always stakeholders who want to know what the team is working on, but who do not need to hear about each product backlog item (User story) in detail
- The success of the sprint will later be assessed during the Sprint Review Meeting against the sprint goal, rather than against each specific item selected from the product backlog
- <http://www.mountaingoatsoftware.com/scrum/sprint-planning-meeting>

# Toteutettavien user storyjen valinta

- Sprintin tavoitteen asettamisen lisäksi tulee valita backlogista sprintin aikana toteutettavat User storyt
- Pääperiaate on valita ”sopiva määrä” backlogin korkeimmalle priorisoituja Storyjä

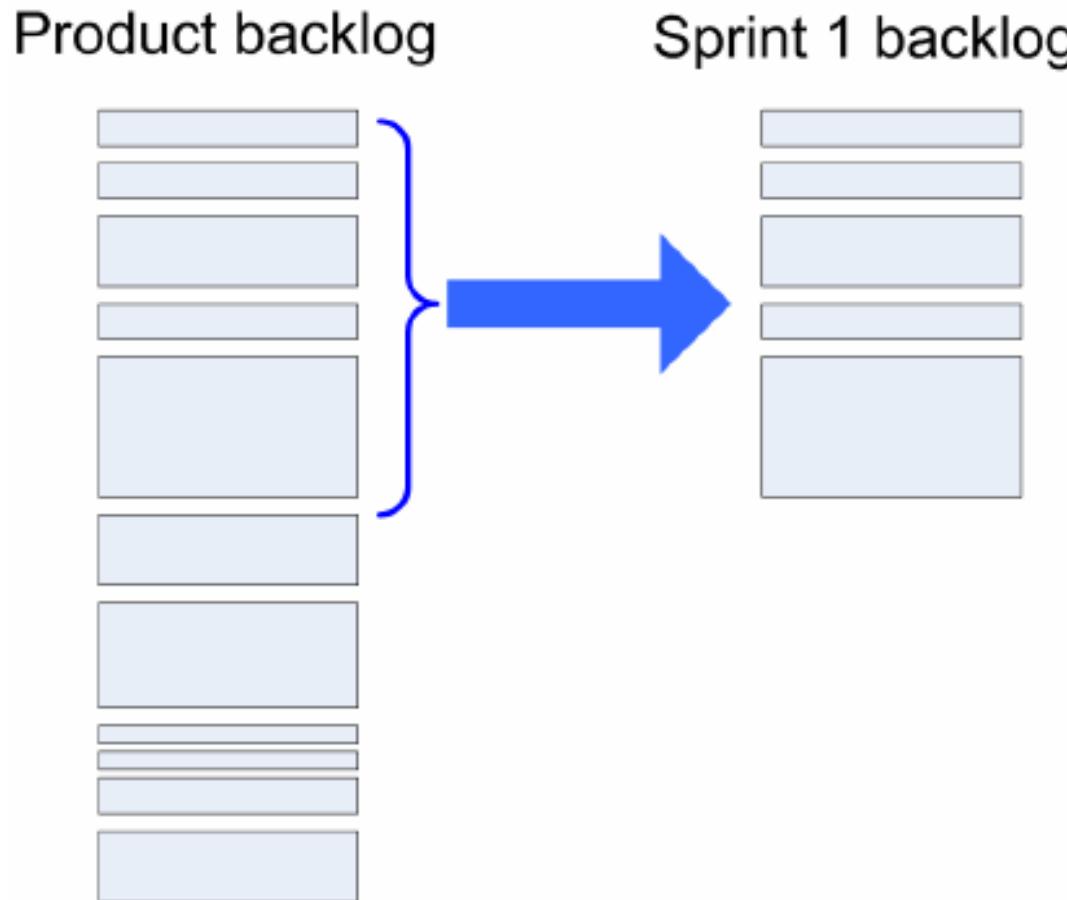

- Valituksi tulevat Storyt siirretään **sprintin backlogiin**


# Sprintiin otettavien User storyjen määrä

- Kehitystiimi siis päättää kuinka monta User storyä sprintiin otetaan toteutettavaksi
- Tapoja päättäää kuinka monta User storya sprintiin otetaan on muutamia:
  - "perstuntuma": otetaan niin monta korkeimman priotiteetin Storyä kuin mihiin kaikki tiimiläiset tuntevat voivansa sitoutua
  - Jos storyt on estimoitu ja tiimin velositeetti tunnetaan, otetaan sprintiin velositeetin verran storyjä
  - Edellisten yhdistelmä
- Jos User storyjä ei ole estimoitu tai velositeetti ei ole tiedossa, "perstuntumamenetelmä" lienee ainoa jota voidaan käyttää
  - Tässäkin menetelmässä tiimi saa sitoutua vain sellaiseen määrään jonka se kokee voivansa toteuttaa kunnolla eli "definition of done" määrittelemän (eli suunnittelu, toteutus, automaattiset testit, testaus, integrointi, dokumentointi) mukaan valmiiksi
  - Velositeetin käsite ja estimaatithan huomioivat "definition of done"

# Toteutettavien user stroyjen valinta

- Jos tiimin velositetti on tiedossa ja User storyt on estimoitu, otetaan Storyjä mukaan maksimissaan velositeetin verran
- Product ownerilla on mahdollisuksia vaikuttaa sprinttiin mukaan otettaviin User storyihin tekemällä uudelleenpriorisointia


Product backlog

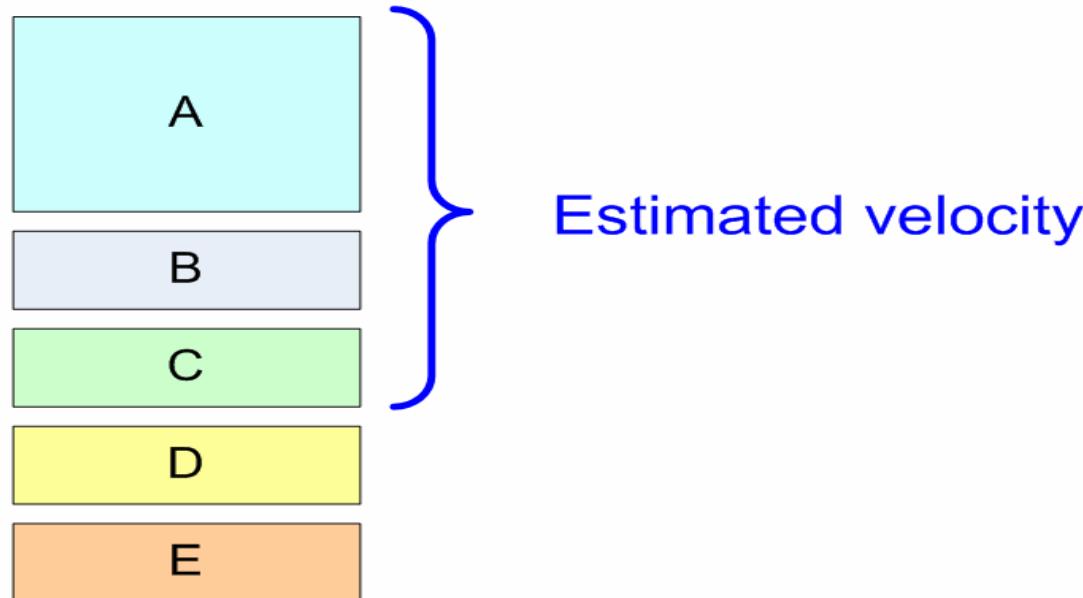

- Product Owner haluaa storyn D mukaan sprinttiin

# Uudelleenpriorisointi


- Product Owner nostaa D:n prioriteettia, C tippuu pois sprinttiin valittavien User Storyjen joukosta

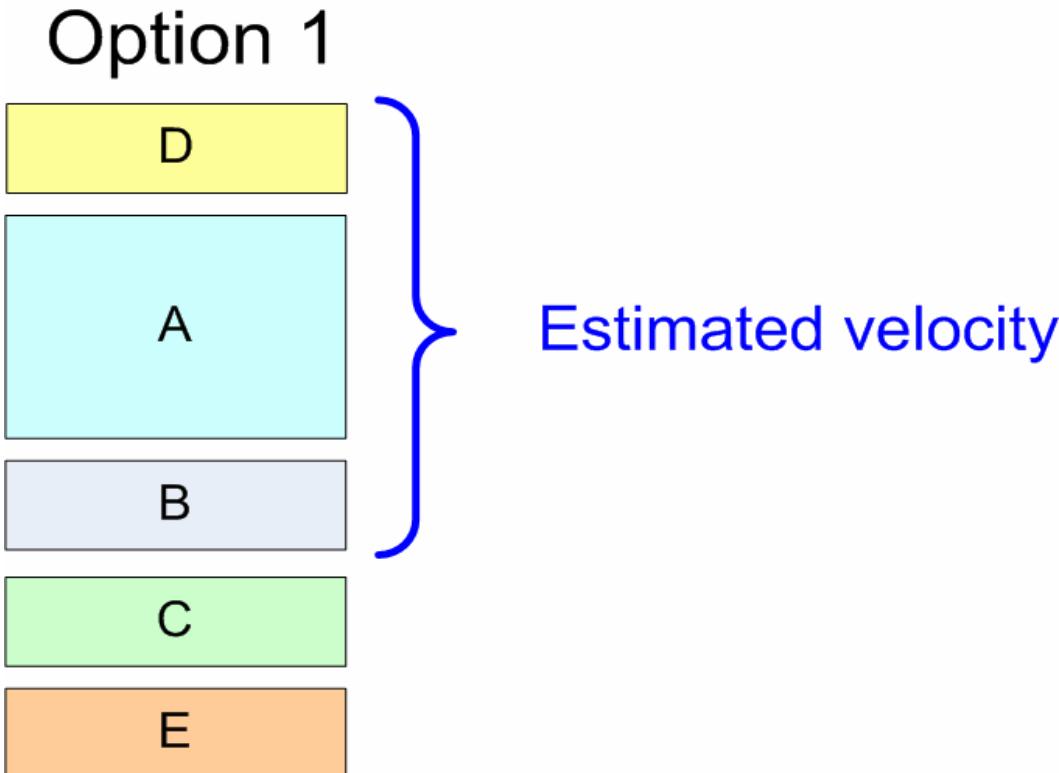

- Entä jos Product Owner haluaa Sprinttiin mukaan kaikki User Storyt A-D?

# User Storyn scopen pienentäminen

- *Jostain on luovuttava:* Product owner pienentää User storyn A määrittelemää toiminnallisuutta, kehitystiimi estimoi pienennetyn A:n ja nyt A-D mahtuvat sprinttiin:

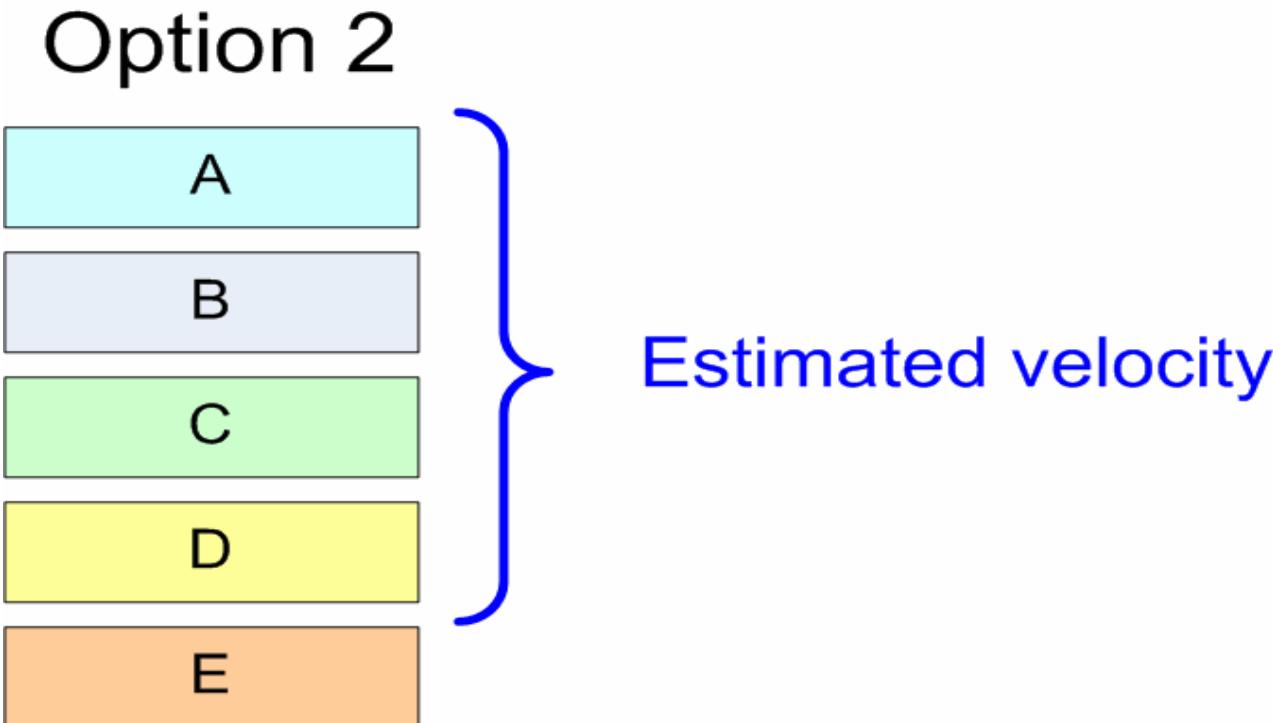


- Entä jos A:n toiminnallisuutta ei saa karsia ja silti Product Owner haluaa A-D:n mukaan sprinttiin?

# User Storyn jakaminen

- Ratkaisu on jakaa User story A kahteen pienempään osaan A1:n ja A2:n
  - A1 sisältää A:n tärkeimmät piirteet ja otetaan mukaan sprinttiin
  - A2 saa alempaan prioriteetin ja jää sprintin ulkopuolelle

## Option 3

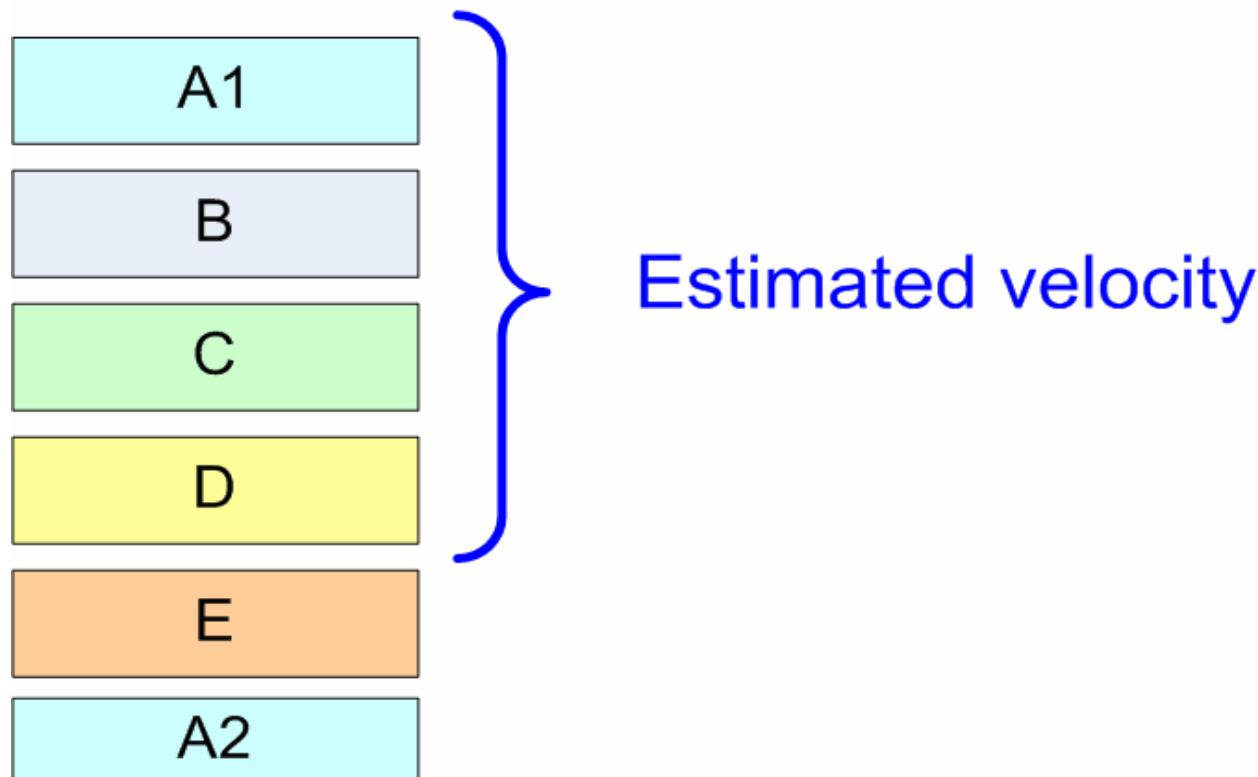

# User storyjen jakaminen

- Storyjen jakaminen pienemmiksi ei ole aloittelijalle, eikä aina ammattilaisellekaan helppoa
- Seuraavassa Richard Lawrencen ohjeita
  - <http://www.richardlawrence.info/2009/10/28/patterns-for-splitting-user-stories/>
- Good user stories follow Bill Wake's INVEST model. They're Independent, Negotiable, Valuable, Estimable, Small, and Testable
- Many new agile teams attempt to split stories by architectural layer: one story for the UI, another for the database, etc.
  - This may satisfy small, but it fails at independent and valuable.
- How small should stories be?
  - I recommend 6-10 stories per iteration, so how small is small enough depends on your team's velocity.
- Over my years with agile, I've discovered nine patterns for splitting user stories into good, smaller stories.

# User storyjen jakaminen

- Pattern #1: **Workflow Steps**
  - As a content manager, I can publish a news story to the corporate website.

==>
  - ...I can write and save a news story.
  - ...I can edit a saved news story.
  - ...I can publish a news story directly to the corporate website.
  - ...I can publish a news story with editor review.
  - ...I can view a news story on a staging site.
  - ...I can publish a news story from the staging site to production
- Pattern #2: **Business Rule Variations**
  - As a user, I can search for flights with flexible dates.

==>
  - ...as “between dates x and y.”
  - ...as “a weekend in December.”
  - ...as “± n days of dates x and y.”

# User storyjen jakaminen

- Pattern #3: **Major Effort**
  - As a user, I can pay for my flight with VISA, MasterCard, Diners Club, or American Express.

==>

    - ...I can pay with one credit card type (of VISA, MC, DC, AMEX).
    - ...I can pay with all four credit card types (VISA, MC, DC, AMEX) (given one card type already implemented).
- Pattern #4: **Simple/Complex**
  - As a user, I can search for flights between two destinations.

==>

    - ...specifying a max number of stops.
    - ...including nearby airports.
    - ...using flexible dates.
    - ...etc.

# User storyjen jakaminen

- Pattern #6: **Data Entry Methods**
  - As a user, I can search for flights between two destinations.  
==>
  - ...using simple date input.
  - ...with a fancy calendar UI.
- Pattern #7: **Operations**
  - As a user, I can manage my account.  
==>
  - ...I can sign up for an account.
  - ...I can edit my account settings.
  - ...I can cancel my account

# User storyjen jakaminen


- Pattern #8: **Defer Performance**
  - As a user, I can search for flights between two destinations.

==>
  - ... (slow—just get it done, show a “searching” animation).
  - ... (in under 5 seconds).
- Pattern #9: **Break Out a Spike**
  - A story may be large not because it’s necessarily complex, but because the implementation is poorly understood. In this case, no amount of talking about the business part of the story will allow you to break it up.  
**Do a time-boxed spike first to resolve uncertainty around the implementation.** Then, you can do the implementation or have a better idea of how to break it up.
  - As a user, I can pay by credit card.

==>
  - Investigate credit card processing.
  - Implement credit card processing.


# Sprintin suunnittelun toinen vaihe

- Sprintin suunnittelun yhteydessä sprinttiin valituille User storyille tehdään karkean tason suunnittelu
  - Mietitään mitä teknisen tason tehtäviä (Task) on toteutettava, jotta User story saadaan valmiiksi
  - Suunnitellaan komponentteja ja rajapintoja karkealla tasolla
  - Huomioidaan User storyn aiheuttamat muutokset olemassa olevaan osaan sovelluksesta
  - Kaikkia Storyyn liittyviä taskeja ei sprintin suunnittelun aikana välttämättä löydetä
  - Uusia taskeja generoidaan tarvittaessa sprintin edetessä

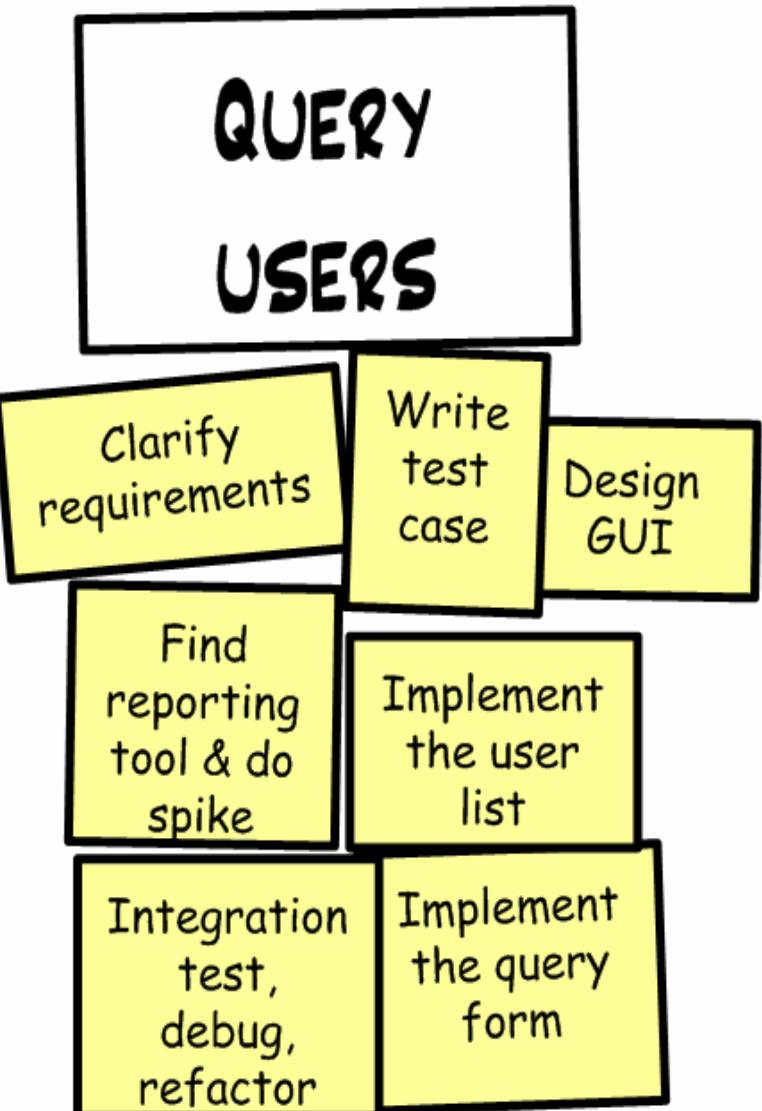


# Sprint backlogin muotoutuminen

- Sprintin suunnittelun "best practise" on monien asiantuntijoiden mielestä käyttää pahvikortteja User storyille ja postit-lappuja teknisen tason tehtäville ja käyttää näitä työvälineenä alustavan sprint backlogin muodostamisessa
  - Näin esim. priorisointi on vaivatonta
  - Elektronisessa muodossa oleva backlog voidaan päivittää tilanteen stabiloiduttua

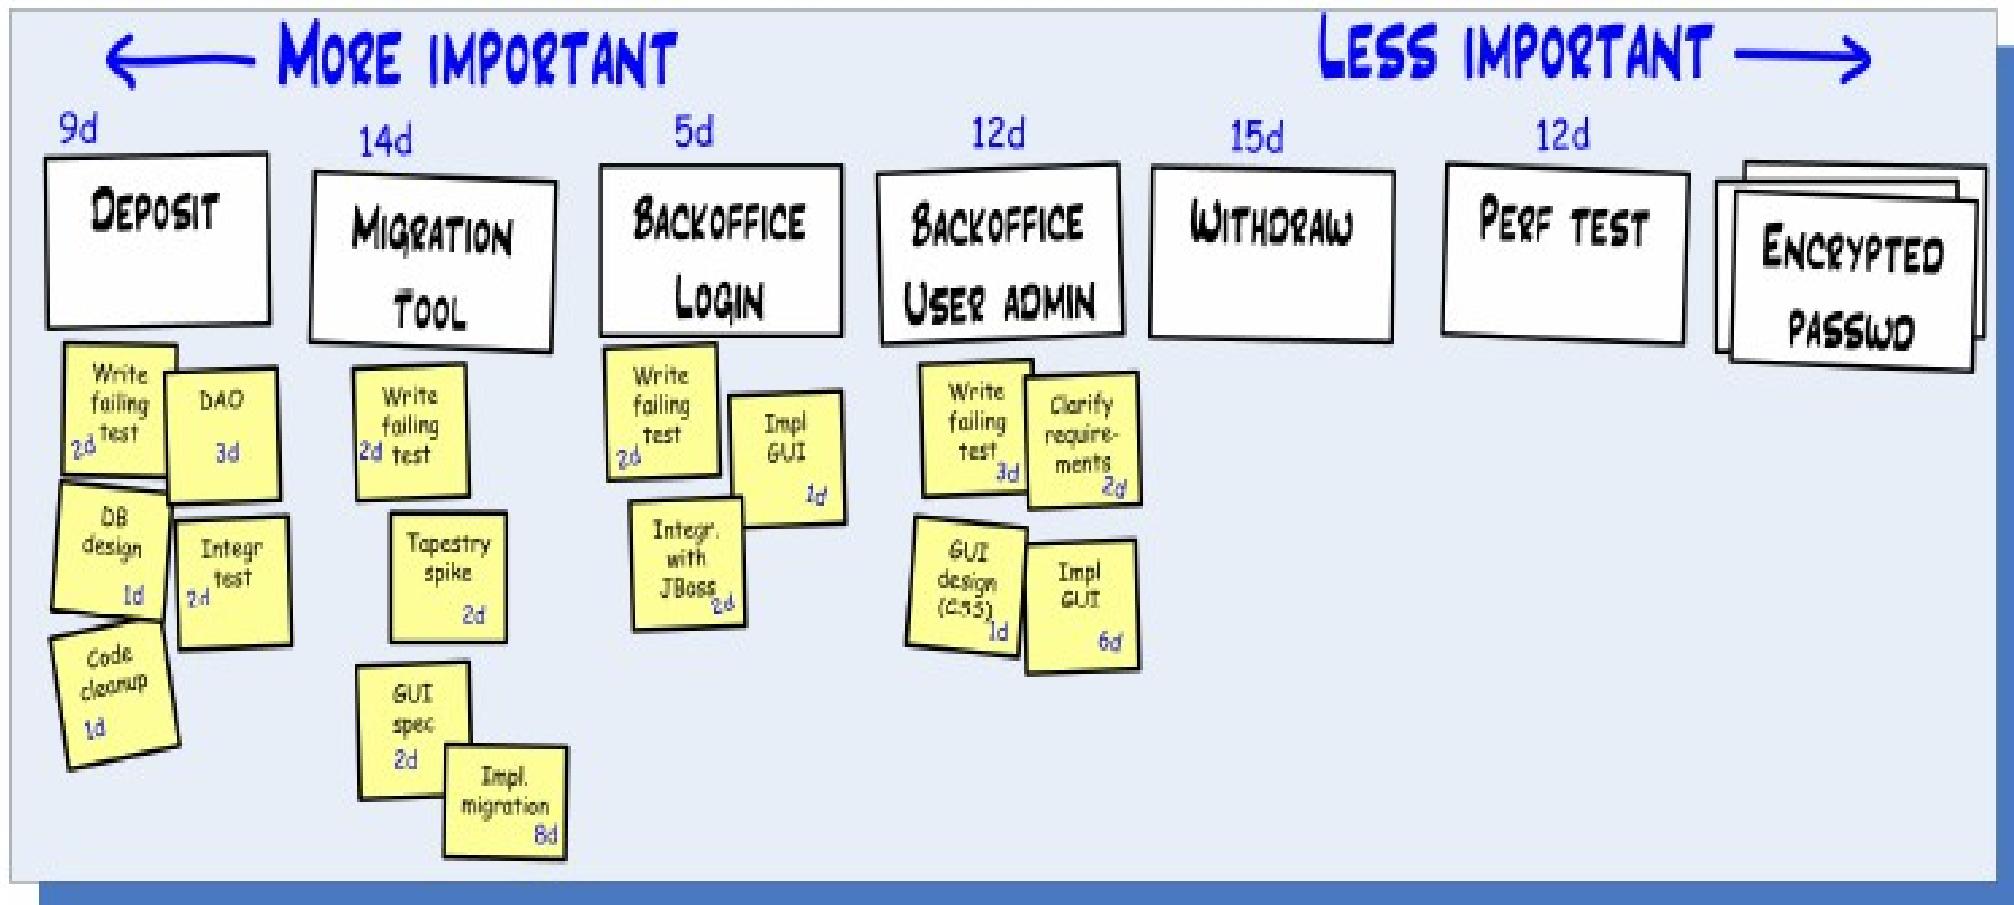

# Sprint backlog

- Sprintin tehtävälistä eli Sprint backlog koostuu sprinttiin valitusta User storeista ja Storeihin liittyvistä tehtävistä eli Taskeista
- Backlog voi olla organisoitu "taskboardiksi":

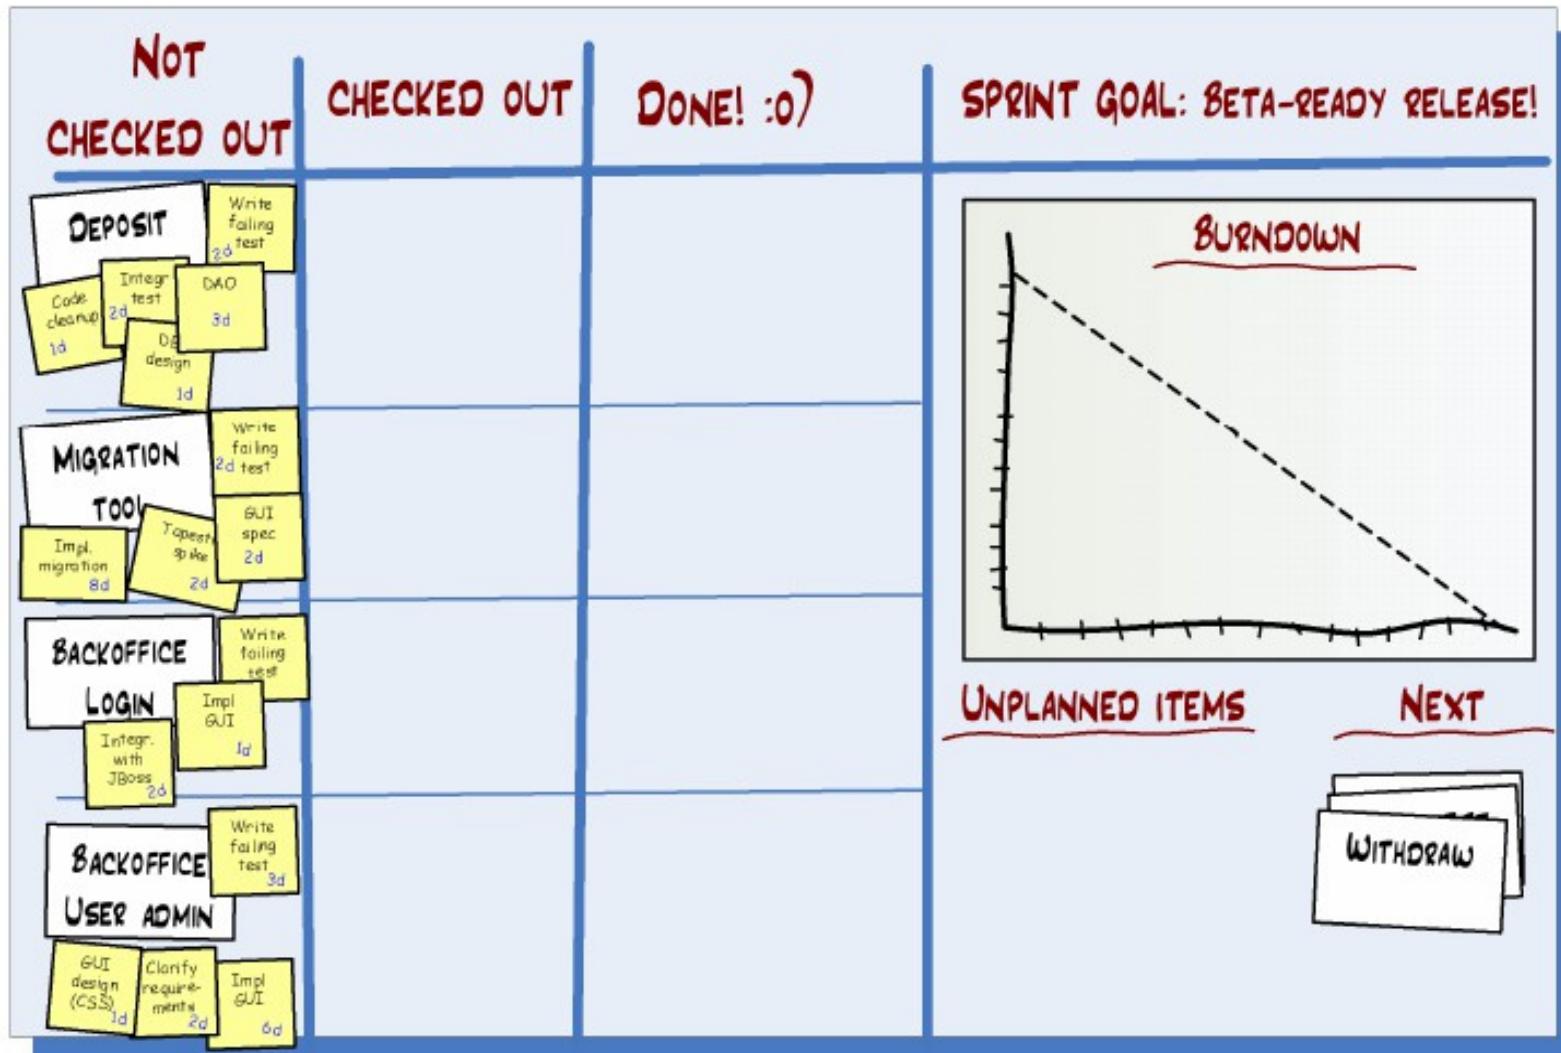

# Taskboard

- Kuvassa sprinttiin on valittu 4 User storyä ja taskboard on jaettu neljään kaistaan, jokaiselle Storylle oma kaista (swimlane)
- Kuten arvata saattaa, jokaisen taskin on tarkoitus siirtyä sarakkeesta "not checked out" sarakkeeseen "done"
- **Sprintissä arvioidaan päivittäin jäljellä olevaksi arvioitua työmääriä**
- Taskien **jäljellä oleva työmääri** arvioidaan yleensä **tunteina**
- Jokaiseen Taskiin kirjataan sen arvioitu vielä vaatima työmääri
  - Jos käytössä on "manuaalinen" taskboard, kirjoitetaan arvio suoraan Taskia edustavaan postit-lappuun
  - Arviota päivitetään joka päivä
  - Arvio voi nousta jos Task huomataakin työläämmäksi mitä alun perin ajateltiin
- On varsin tavallista, että uusia Taskeja keksitään kesken sprintin
  - Uudet Taskit saavat olla ainoastaan kehittäjätiiimin itse identifioimia menossa olevaan sprinttiin liittyviä töitä
- Eli sprintissä jäljellä oleva työaika-arvio voi kasvaa kesken sprintin!

# Sprintissä jäljellä olevan työmääärän arvointi

- Jokaisen taskin jäljellä olevan työn määrä arvioidaan esim. päivittäisessä scrum-palaverissa eli Daily Scrumissa
- Jäljellä olevaa työmääriää (tunteina mitattuna) visualisoidaan sprintin etenemistä kuvaavalla **burndown-käyrällä**
  - Tätä sprintin burndown:ia ei pidä sekottaa projektin burndown-käyrään!



Stuff that nobody is working on today

Stuff that somebody is working on today

Stuff that nobody will work on any more

Manually plot a new point on the burndown every day after the daily scrum.

NOT  
CHECKED OUT


CHECKED OUT

DONE! :)




SPRINT GOAL: BETA-READY RELEASE!



First all activity post-its wander this way




Then the white backlog-item jumps to Done

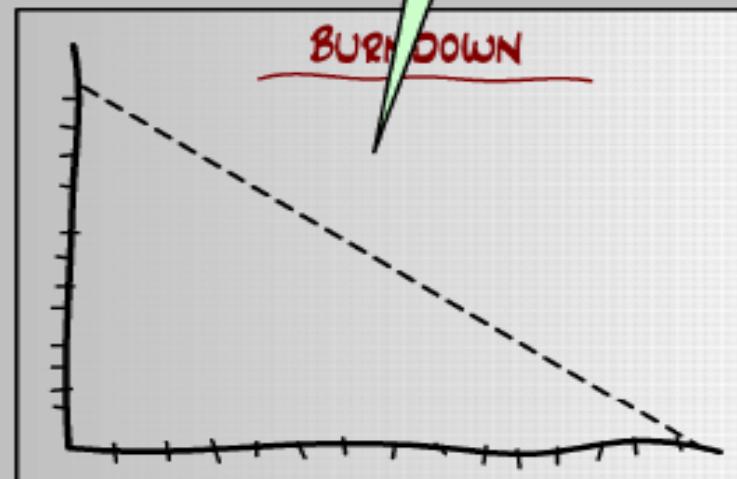


UNPLANNED ITEMS

NEXT




If all backlog items are completed before the sprint ends, add new ones from here.

# Tilanne sprintin alussa

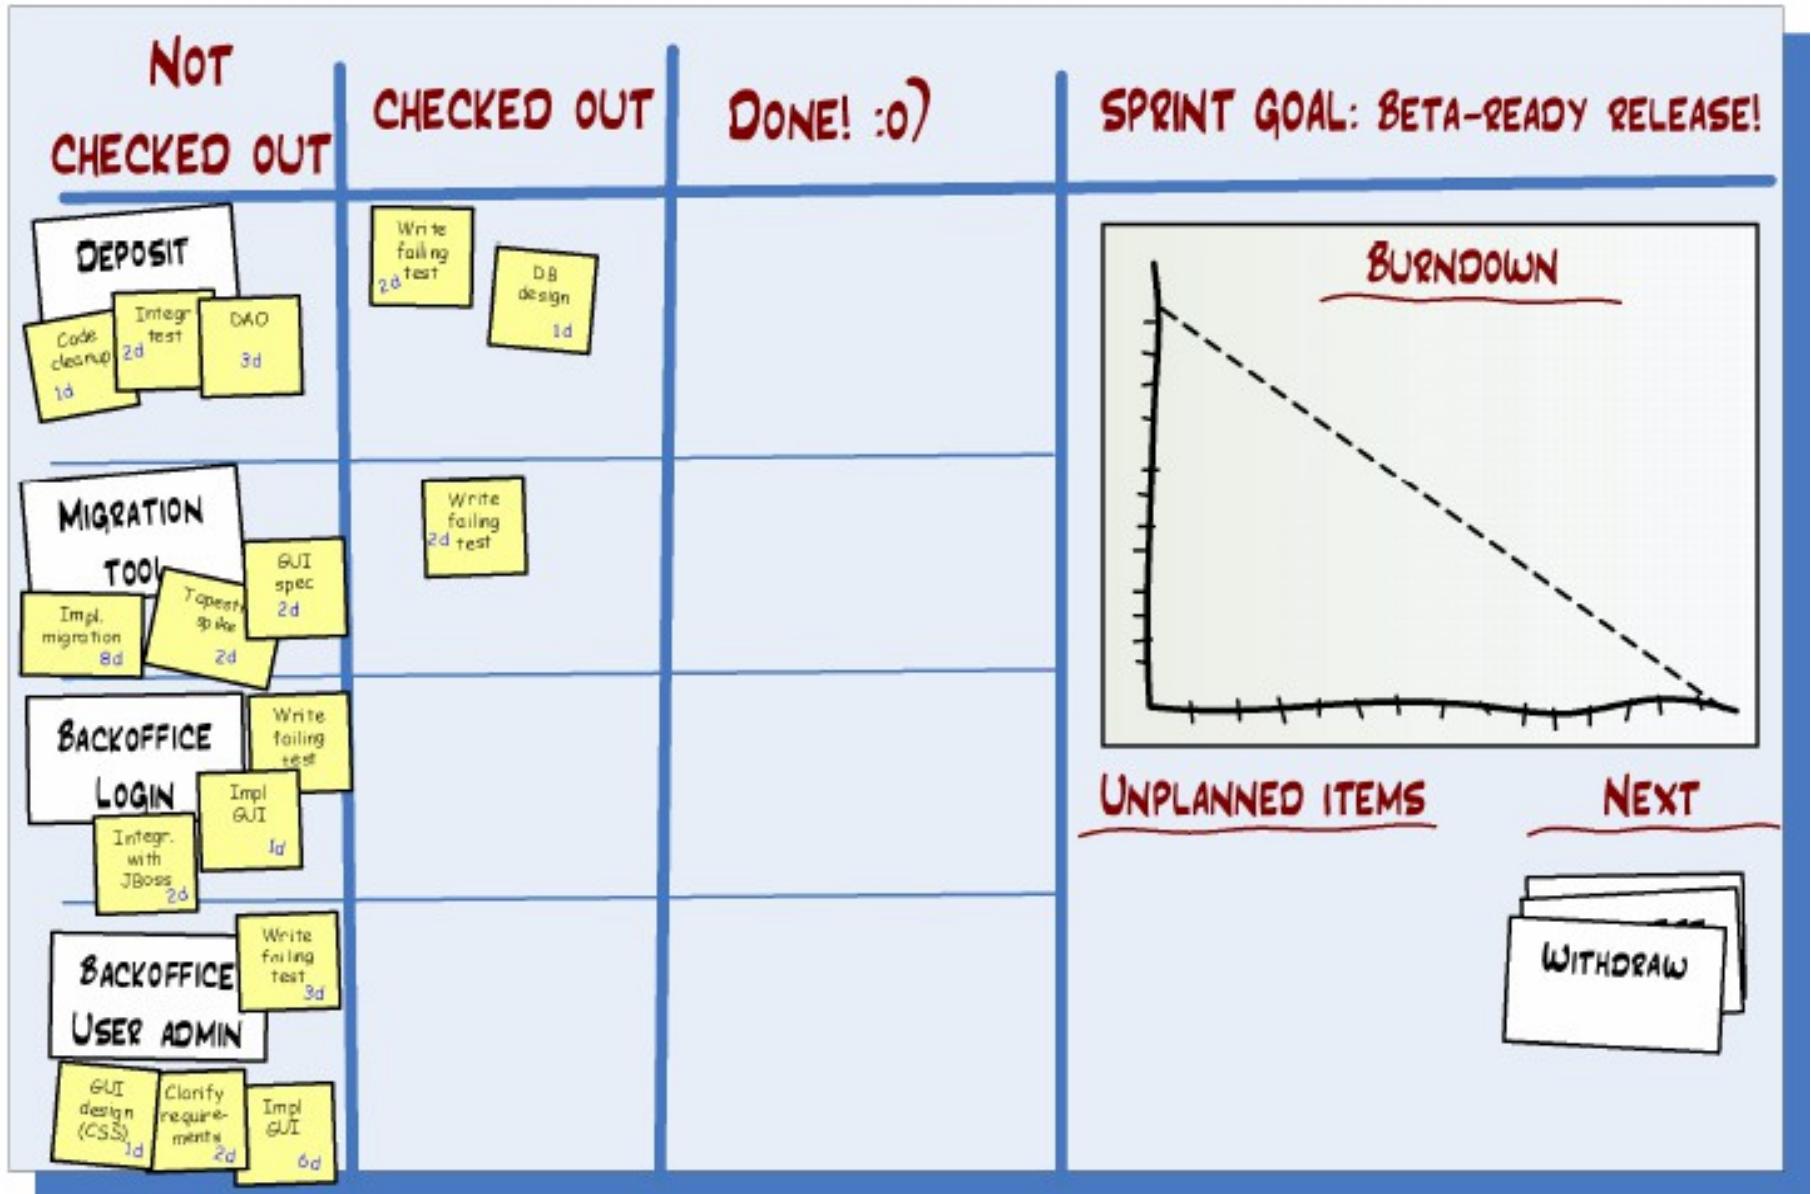

# Ja puolen välin jälkeen

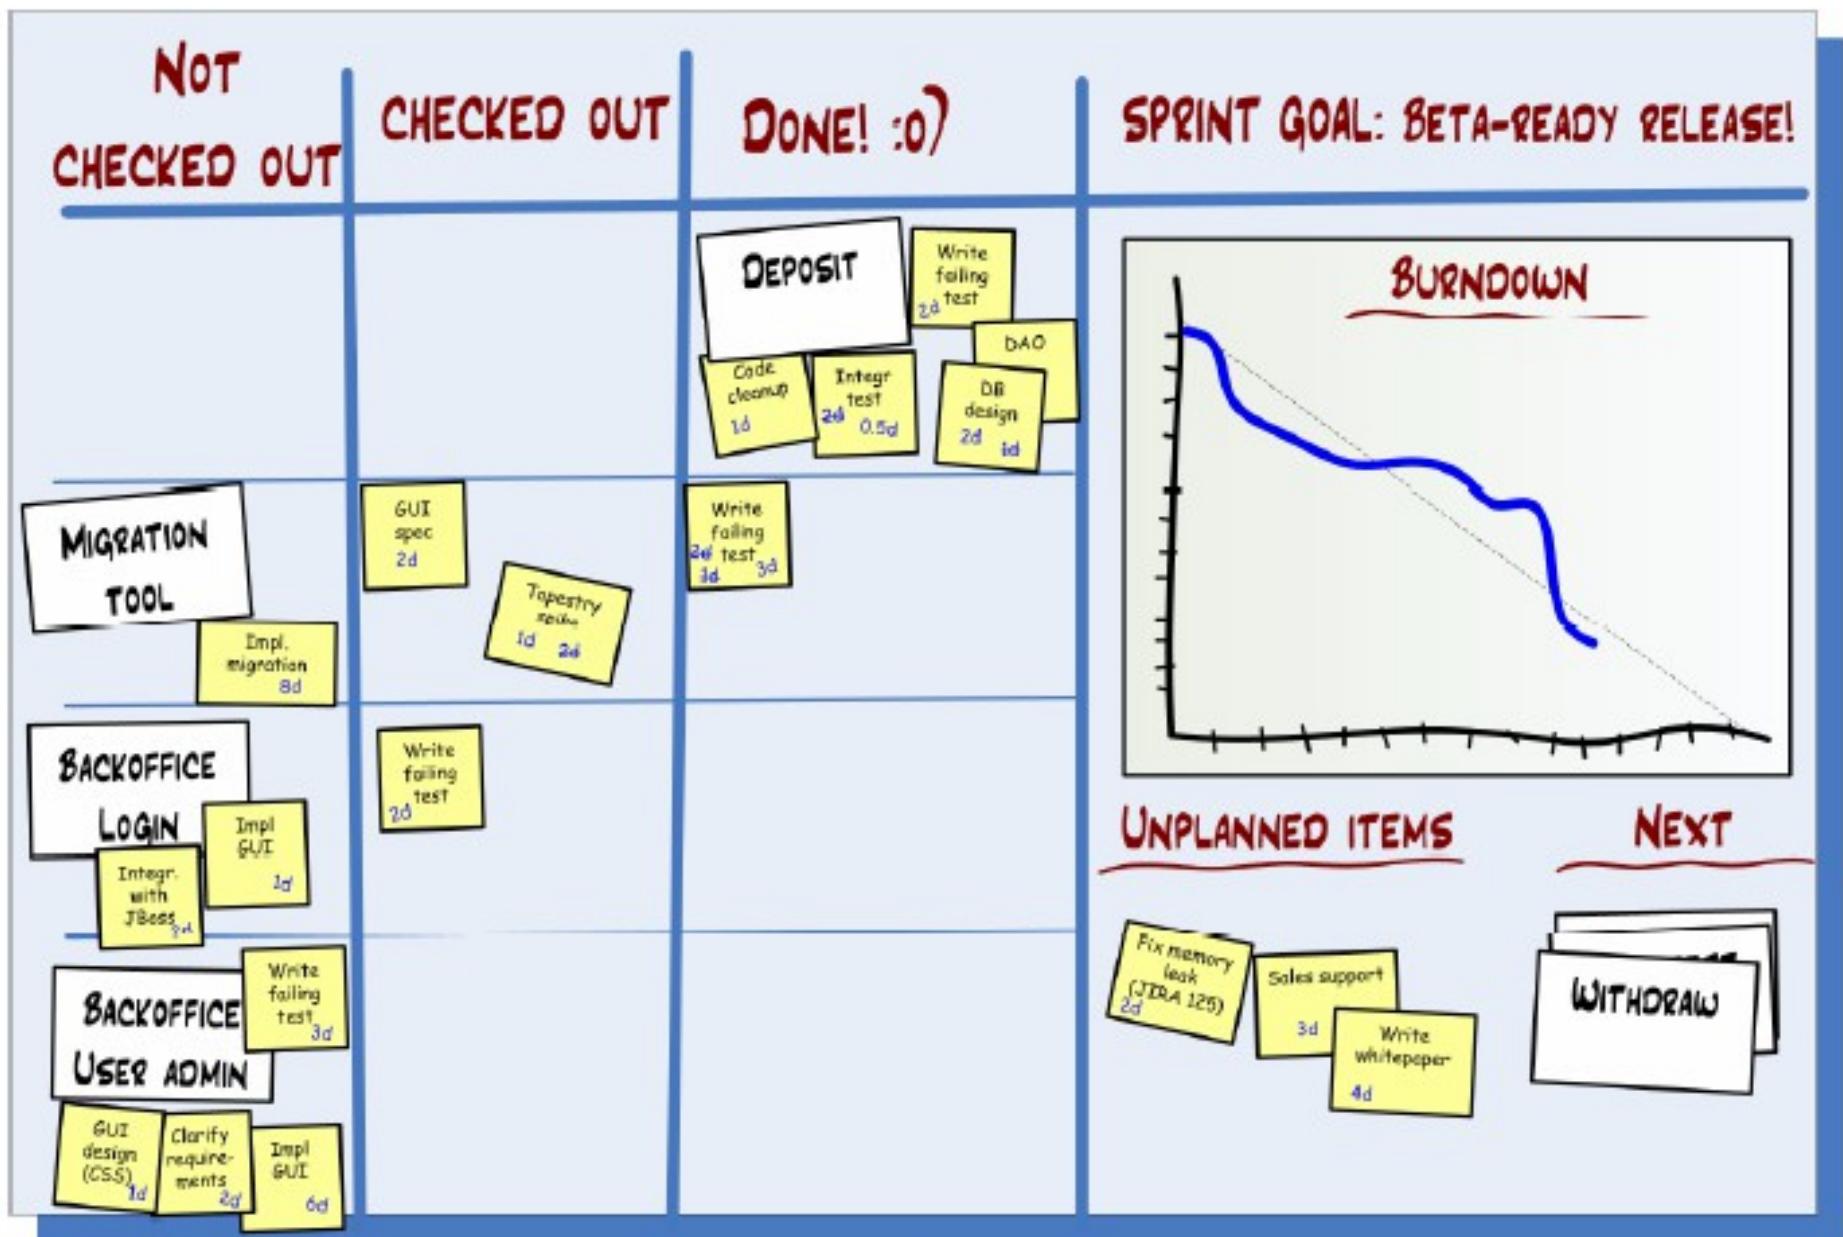


# Taskboardissa voi olla merkattu useampiakin työvaiheita



Story	To Do		In Process	To Verify	Done
As a user, I... 8 points	Code the... 9	Test the... 8	Code the... DC 4	Test the... SC 6	Code the... 9 Test the... SC 8 Test the... SC 8 Test the... SC 6
	Code the... 2	Code the... 8	Test the... SC 8		
	Test the... 8	Test the... 4			
As a user, I... 5 points	Code the... 8	Test the... 8	Code the... DC 8		Test the... SC 8 Test the... SC 8 Test the... SC 6
	Code the... 4	Code the... 8			



- Yhtäaikaa työn alla olevien taskien suuri määrä voi koitua Scrumissa ongelmaksi sillä riski sille, että sprintin päätyttyä on paljon osittain valmiita User storeja kasvaa



# Yhtäaikaa tehtävän työn rajoittaminen



- Voikin olla mielekästä rajoittaa yhtäaikaa tekemisen alla olevien töiden määrää asettamalla "work in progress" (eli WIP) -rajoituksia
  - WIP-rajoitukset on lainattu **Kanban**-menetelmästä
  - Scrumin ja Kanbanin yhdistelmää kutsutaan usein nimellä *Scrumban*
  - Scrumbanissa on tosin muitakin Kanbanista lainattuja elementtejä kuin WIP-rajoitukset
- Esimerkki kirjasta <http://www.infoq.com/minibooks/kanban-scrum-minibook>
- Kunkin vaiheen WIP-rajoitus on merkitty numerona, eli vaiheessa saa olla yhtä aikaa vain rajoituksen verran Taskeja


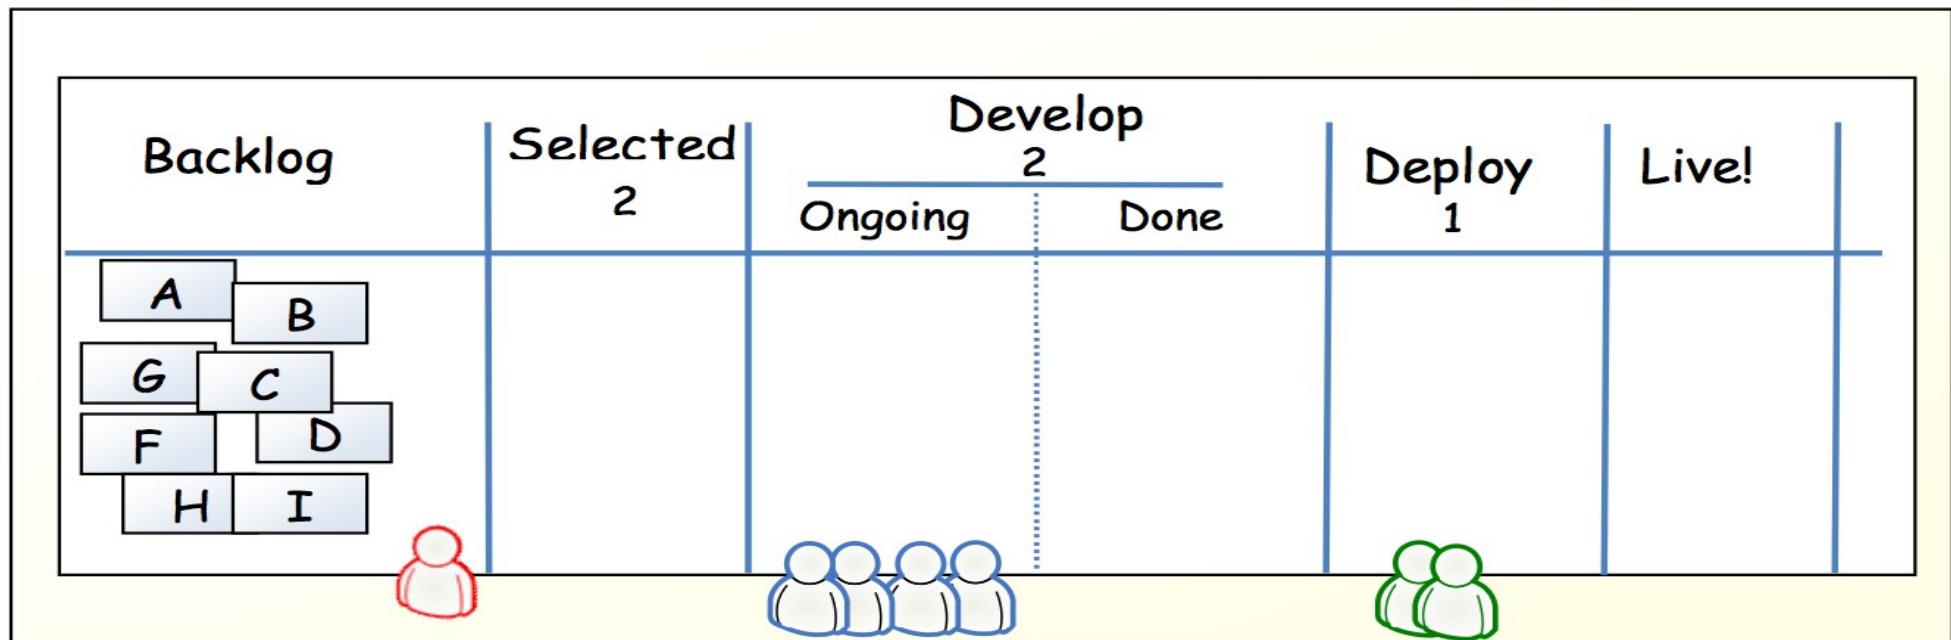


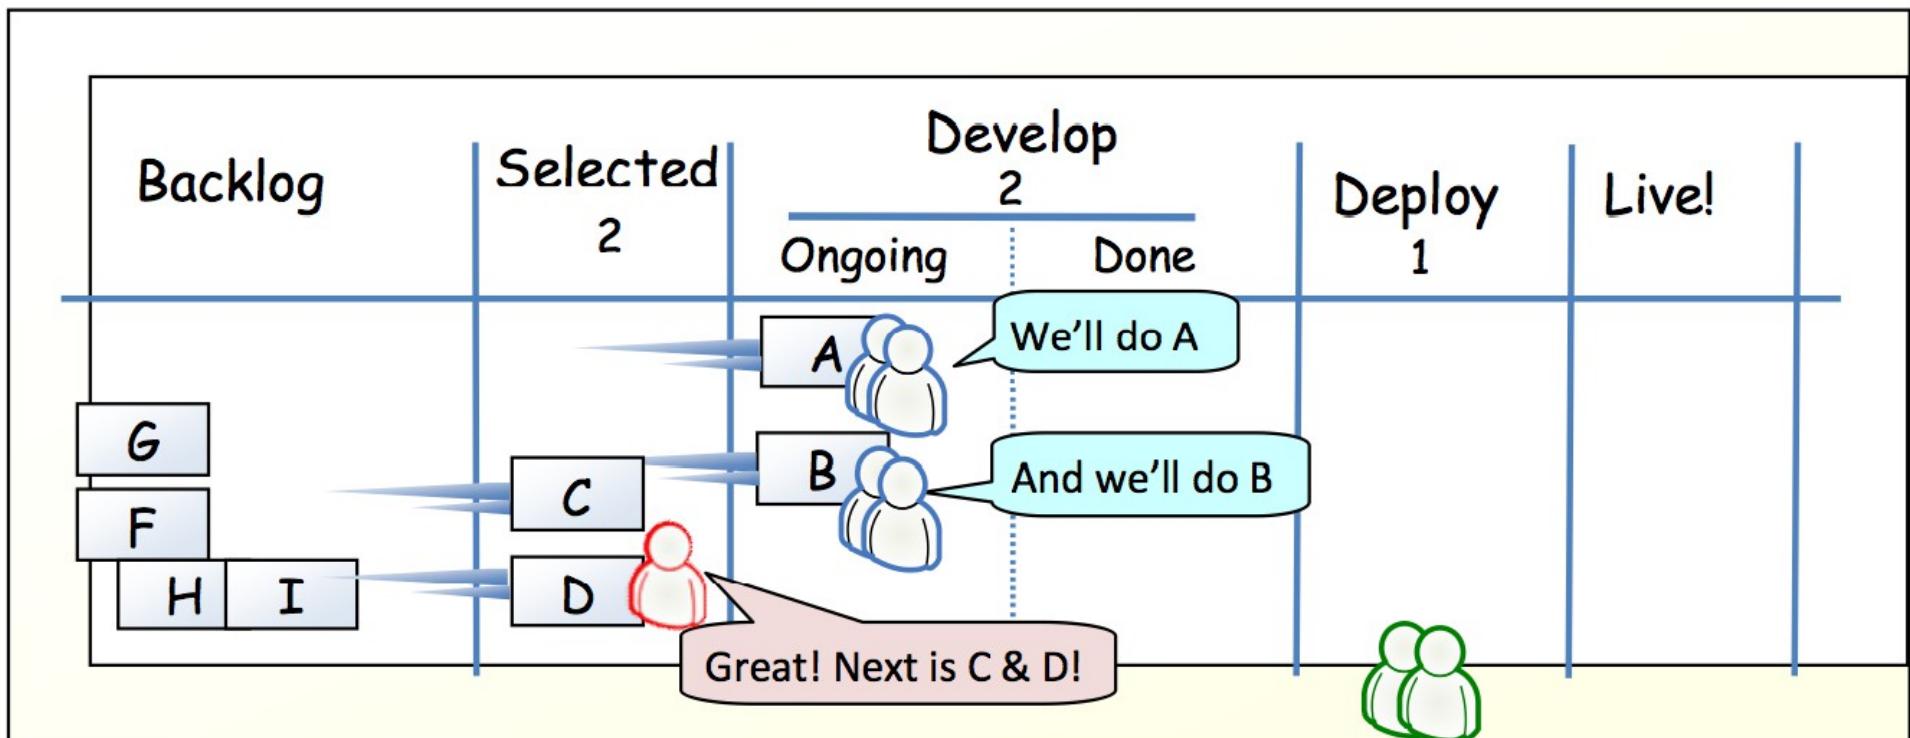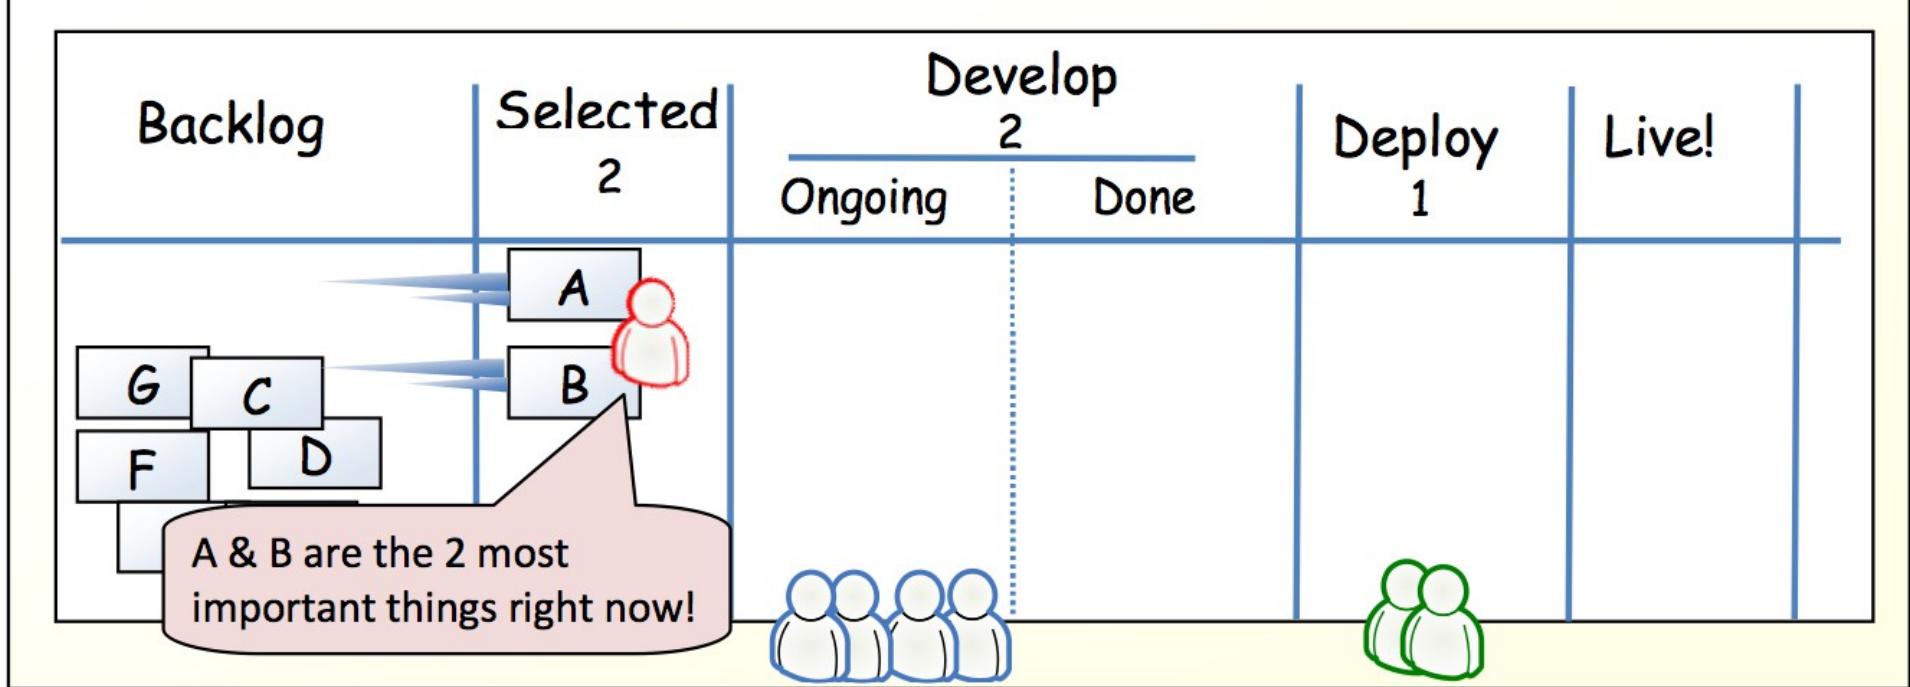

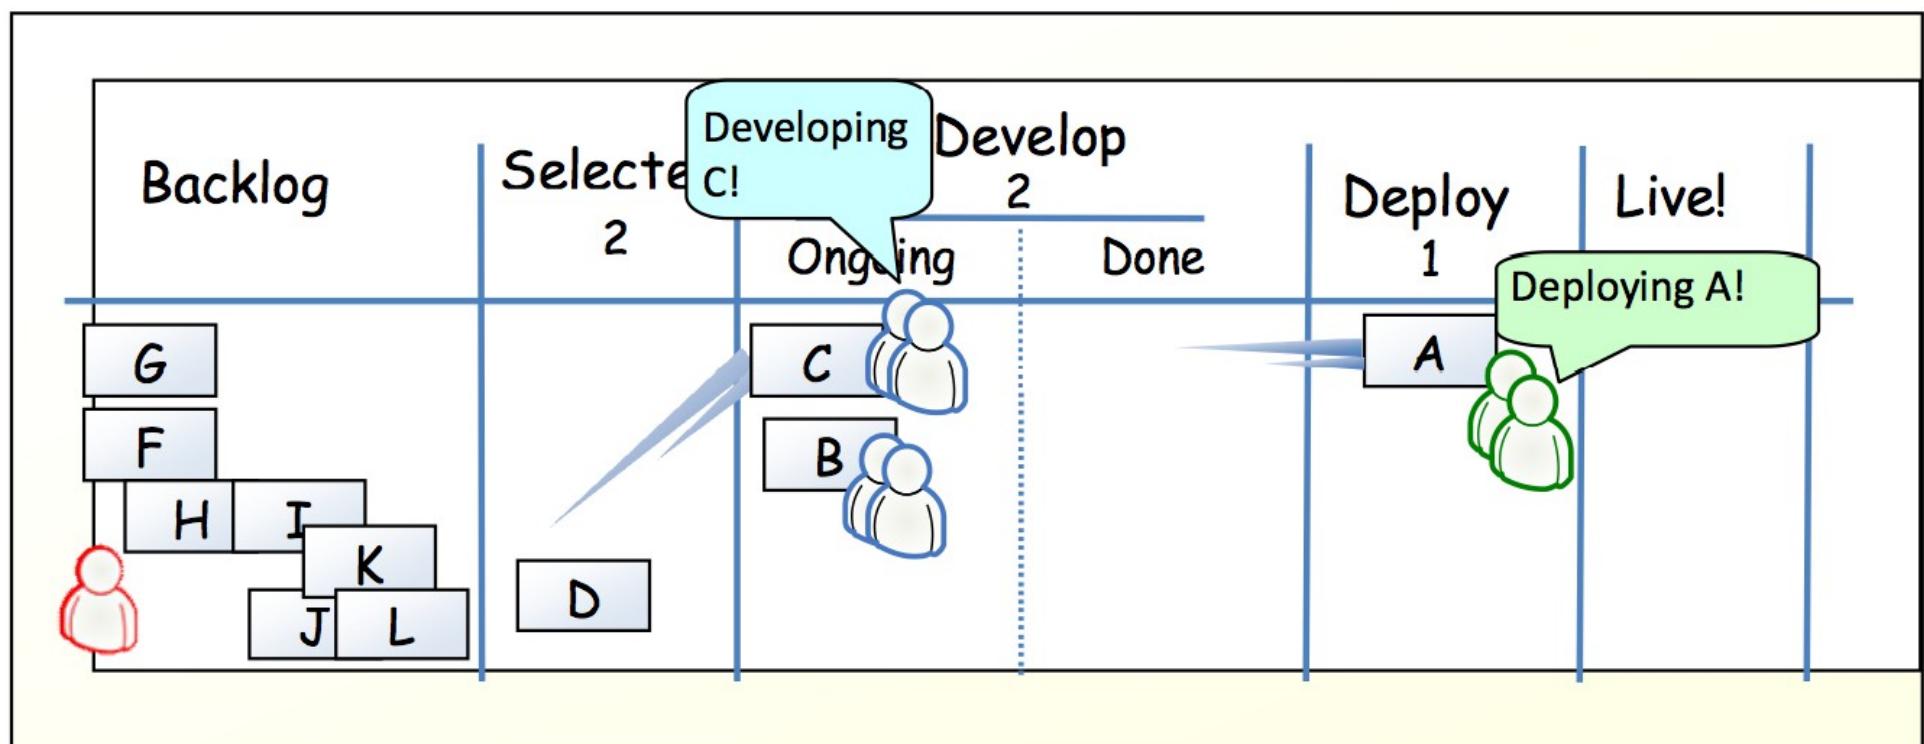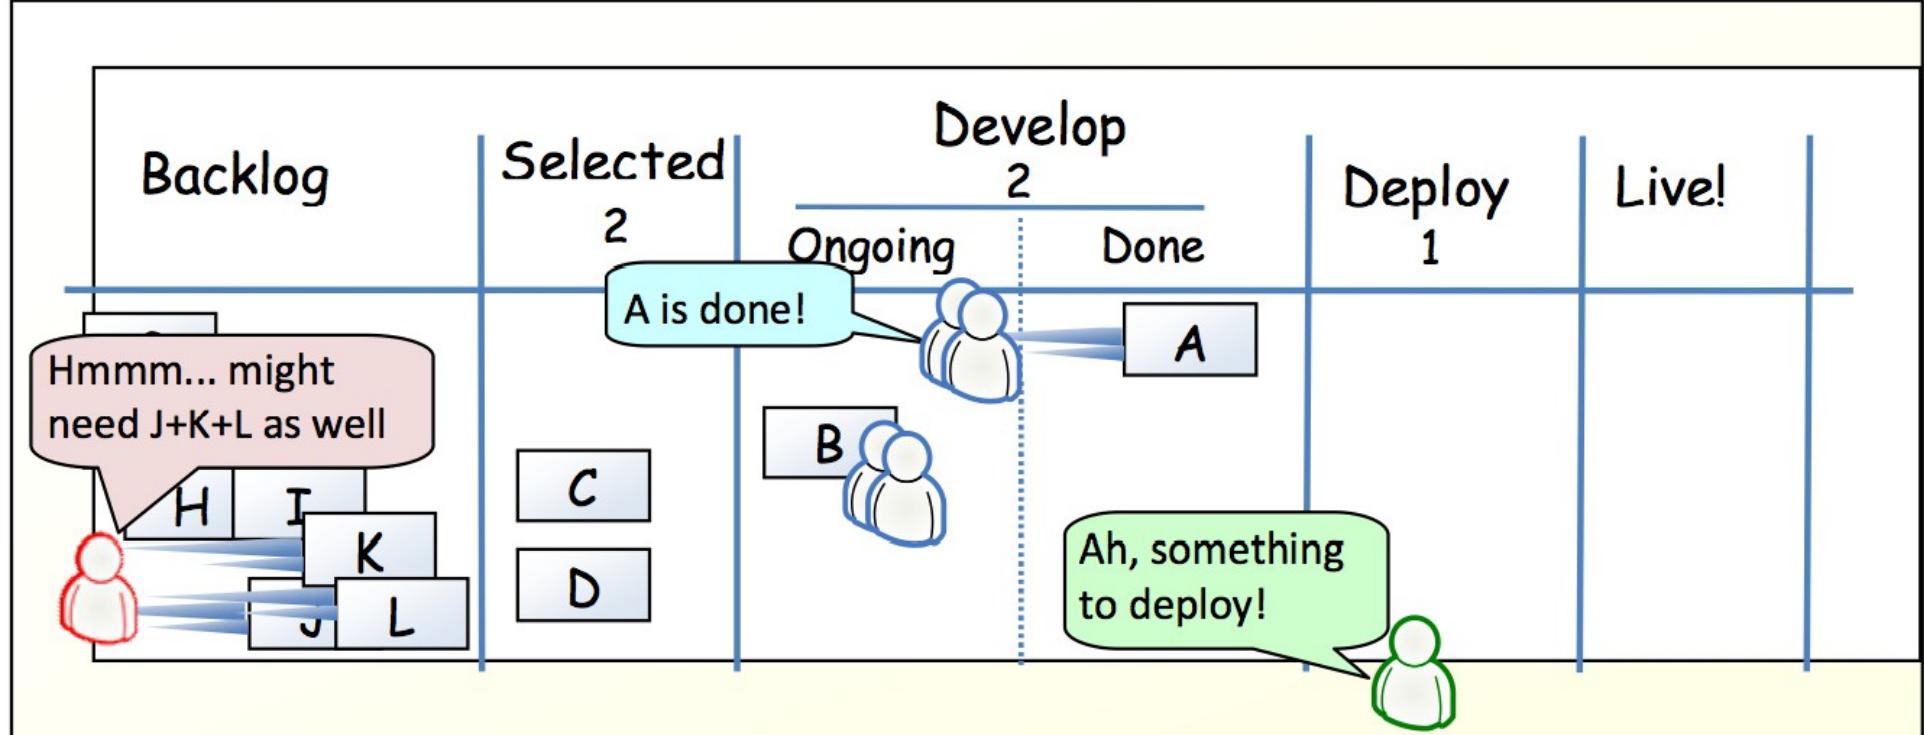

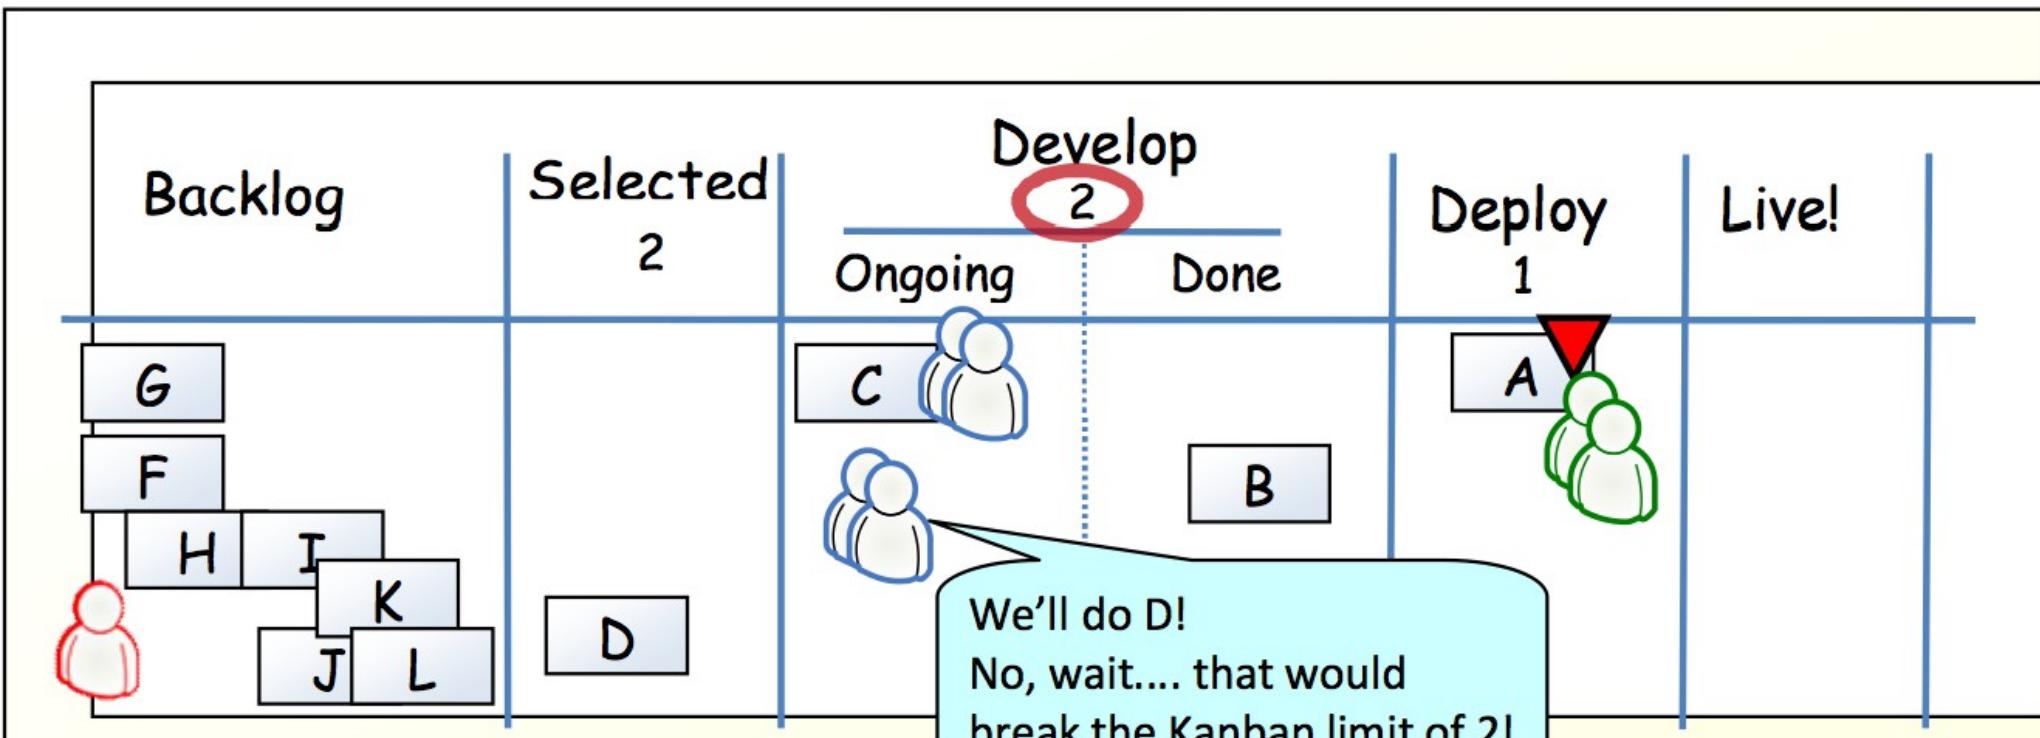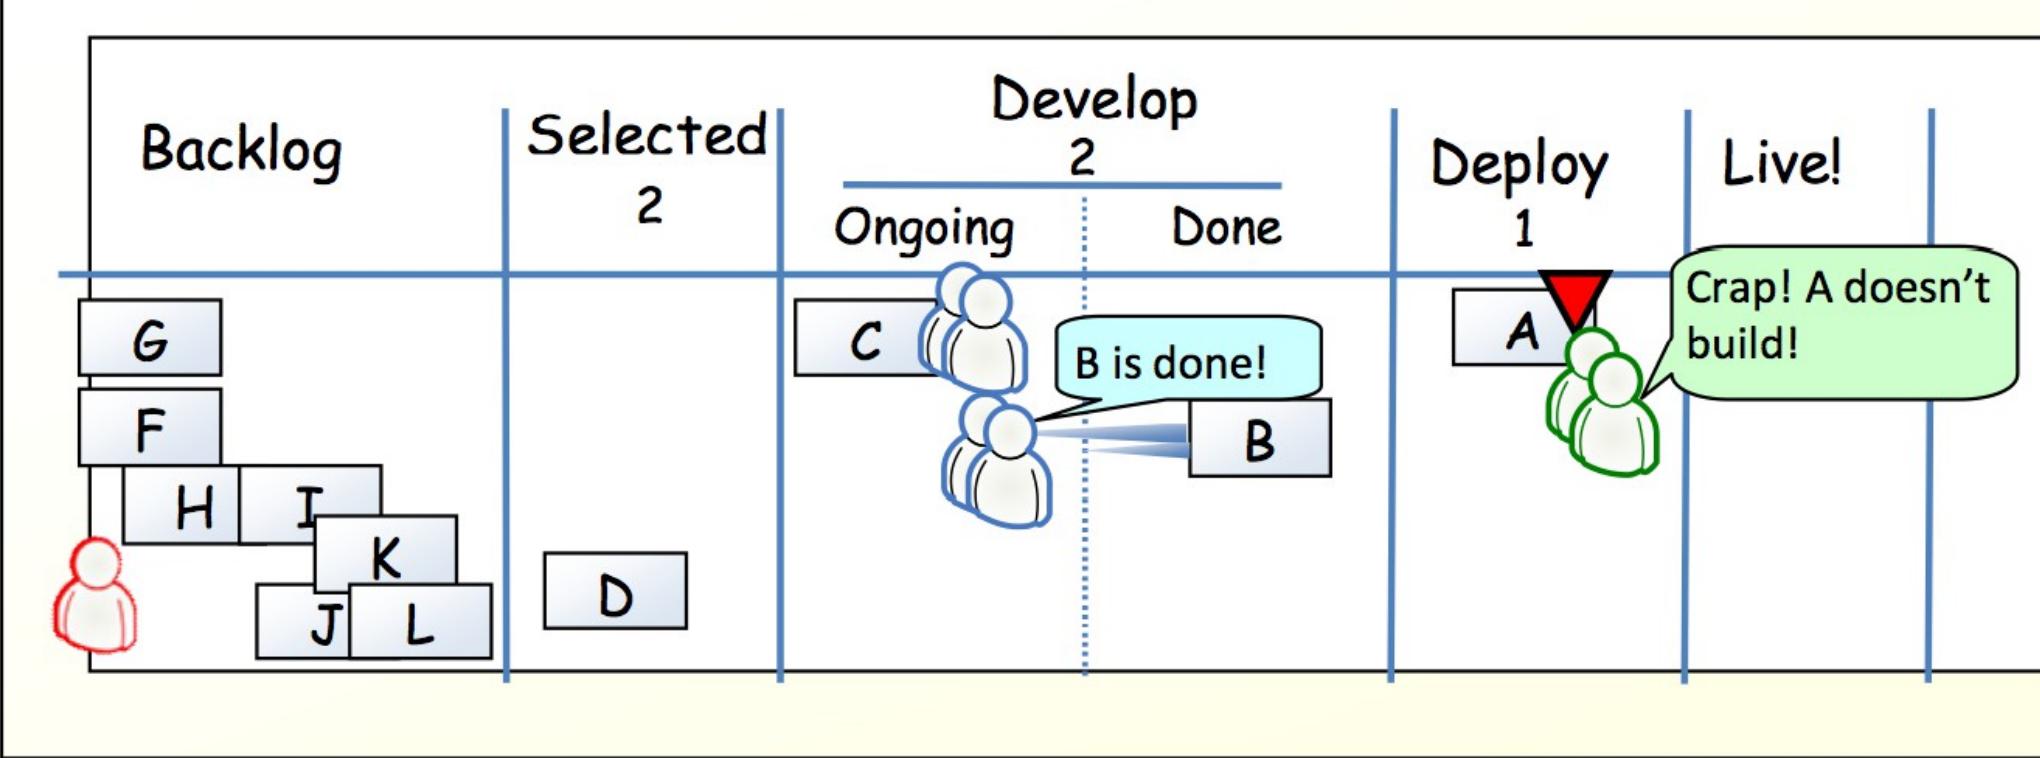

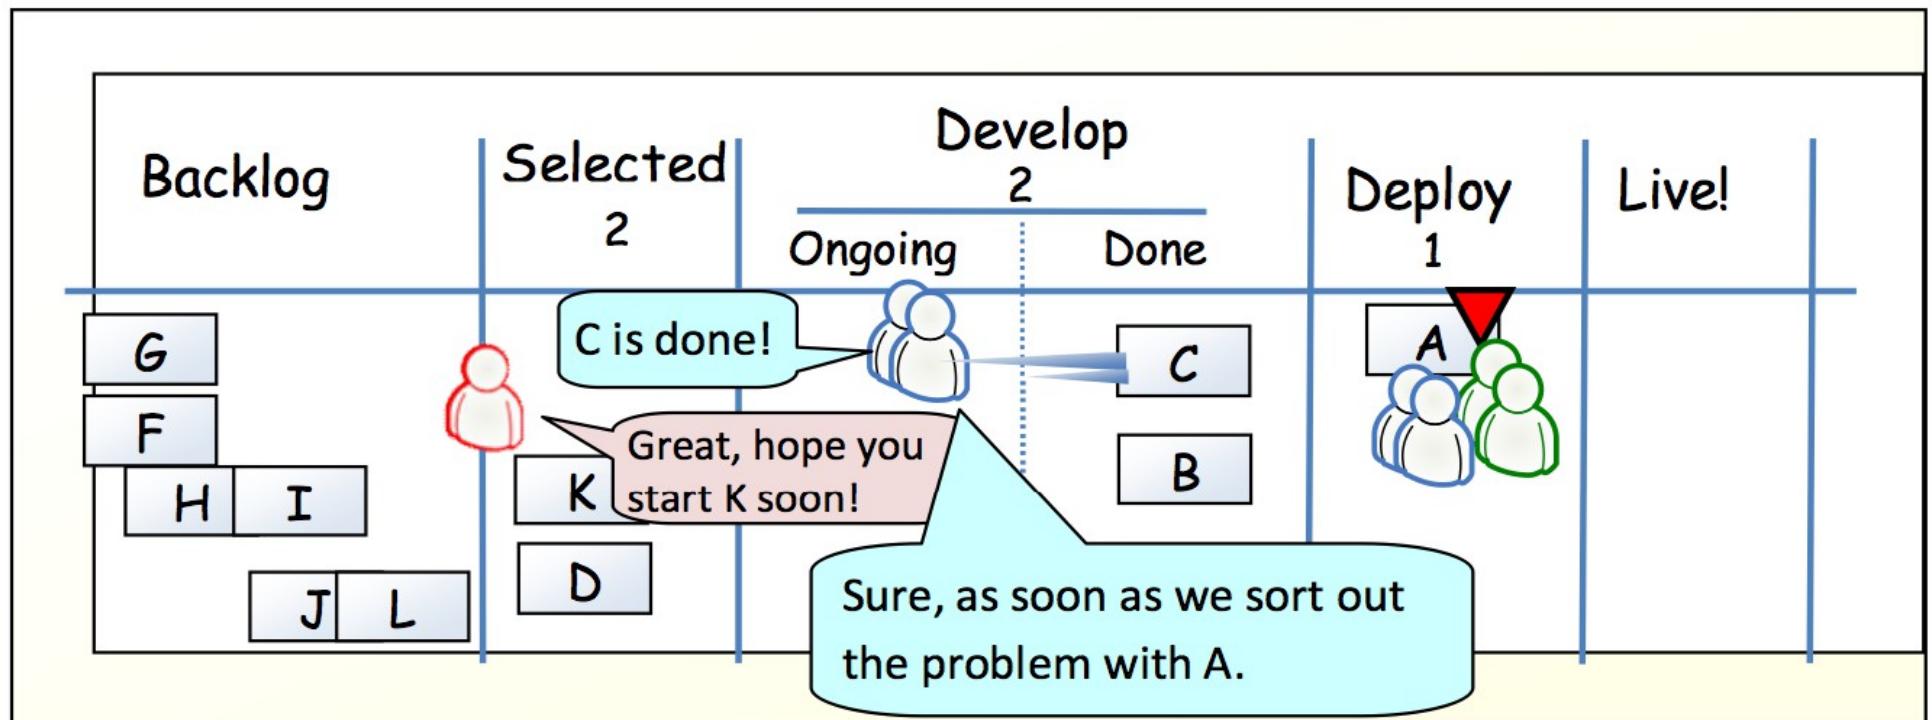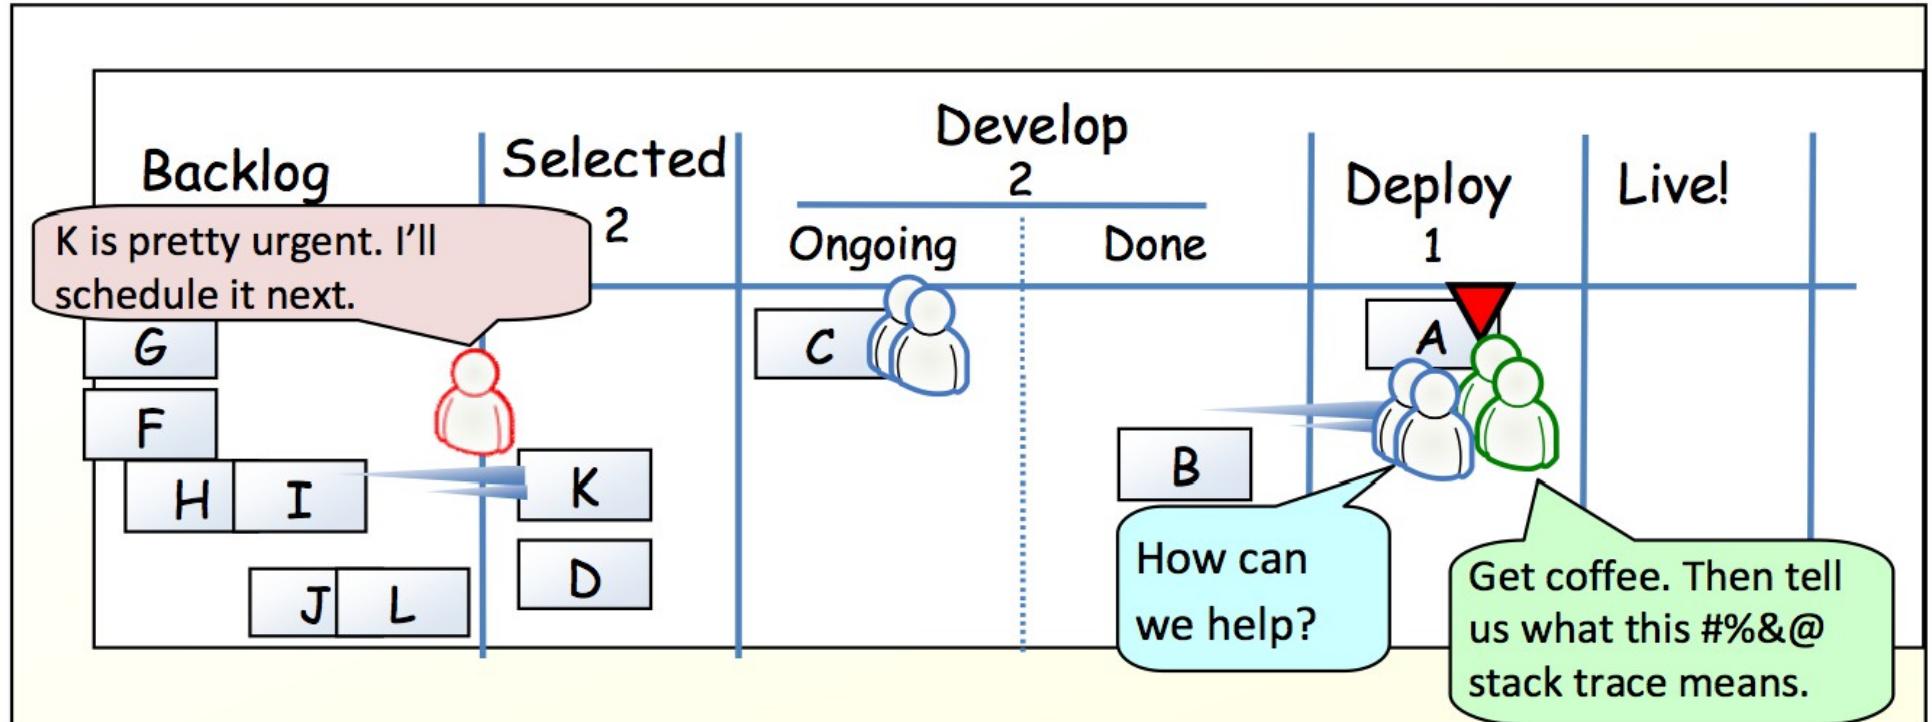

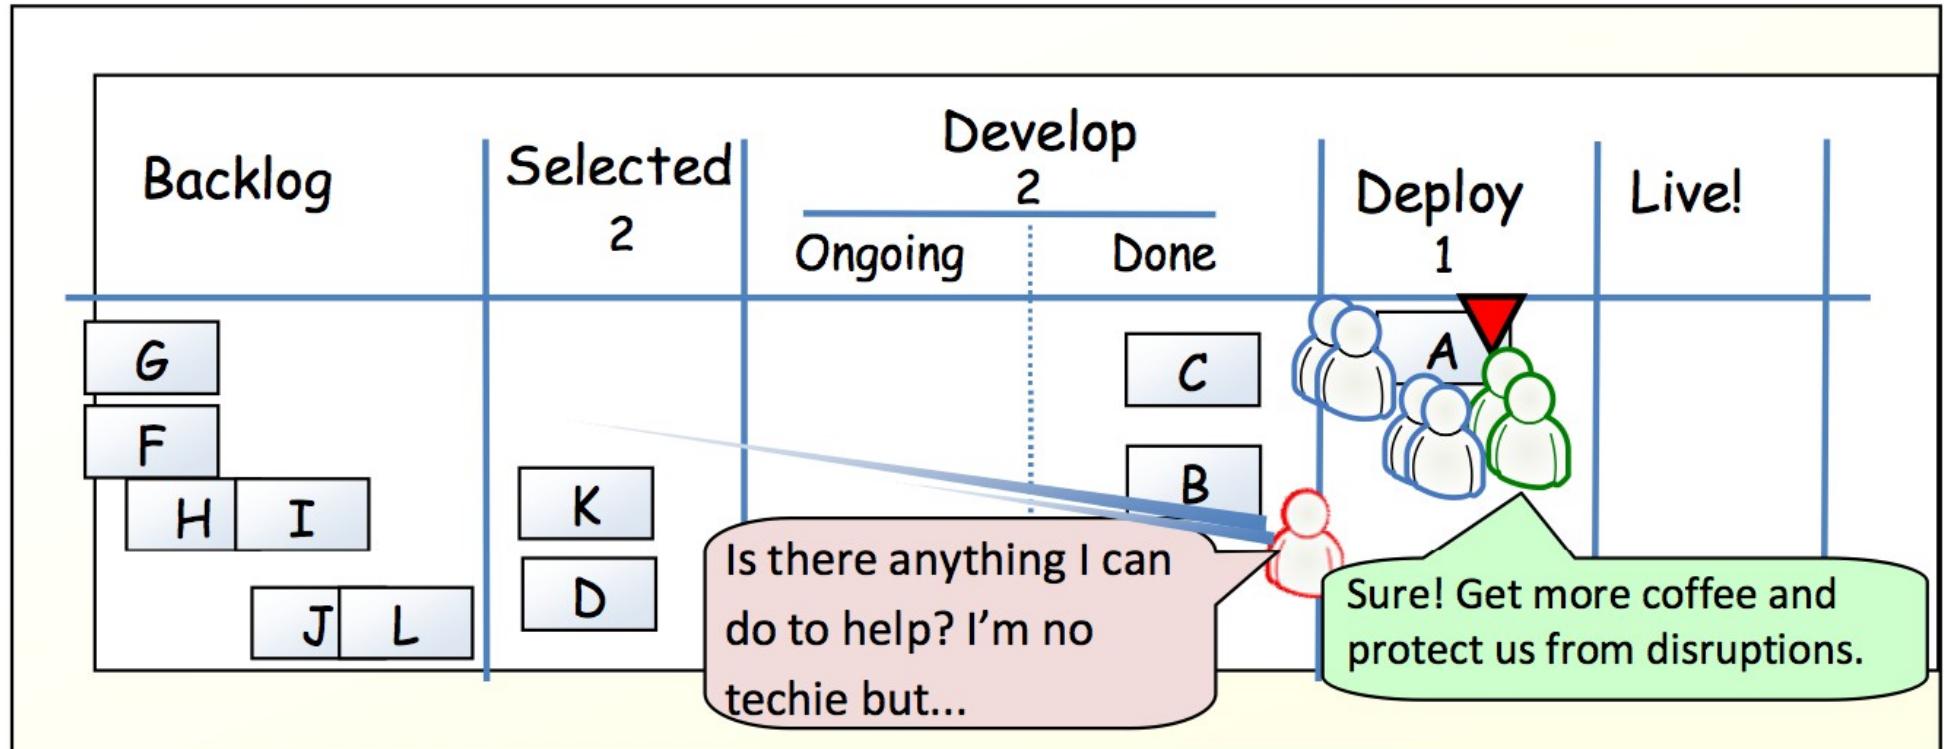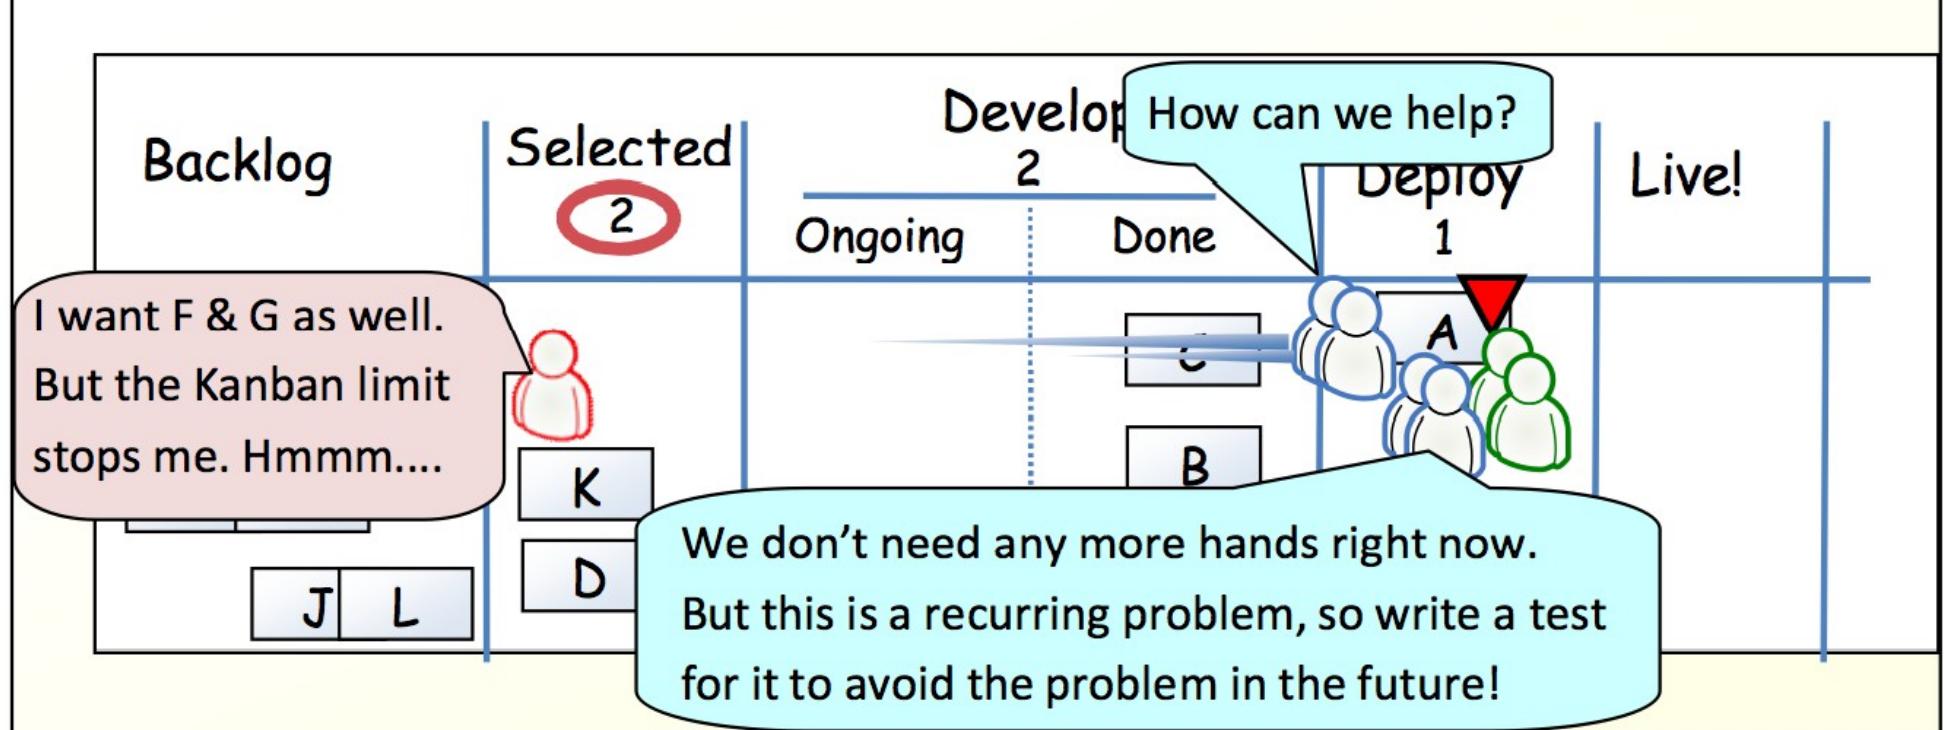

# Sprintin seuranta taulukkomuodossa

- Taskboardin sijaan sprintin seuranta hoidetaan usein taulukkolaskennan avulla, erityisesti jos tiimillä ei ole käytössä omaa "seinää"
- Tällöin sprintin jokaiselle päivälle on oma sarake, johon merkitään kunkin päivän alussa estimaatti taskien jäljellä olevasta työmäärästä (tunteina)

User Story	Tasks	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	...
As a member, I can read profiles of other members so that I can find someone to date.	Code the ...	8	4	8	0		
	Design the ...	16	12	10	4		
	Meet with Mary about ...	8	16	16	11		
	Design the UI	12	6	0	0		
	Automate tests ...	4	4	1	0		
	Code the other ...	8	8	8	8		
As a member, I can update my billing information.	Update security tests	6	6	4	0		
	Design a solution to ...	12	6	0	0		
	Write test plan	8	8	4	0		
	Automate tests ...	12	12	10	6		
	Code the ...	8	8	8	4		

- Erään ohtuprojektiin product- ja sprintbacklogit:
  - [https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aul6gm-diqbXdExfcHh0R1RGb18zbUMybIZvR09TUXc&usp=drive\\_web#gid=1](https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aul6gm-diqbXdExfcHh0R1RGb18zbUMybIZvR09TUXc&usp=drive_web#gid=1)

# Sprintin etenemisen seuranta

- Taskboard ja burndown-käyrä tuovat selkeästi esille sprintin etenemisen asteen ja onkin suositeltavaa, että ne ovat kaikkien tiimiläisten ja projektin sidosryhmäläisten nähtävillä
- Ketterät menetelmät korostavat avoimuutta (transparency) ja tiedon maksimaalista kommunikoitumista, näin mahdolliset ongelmatkaan eivät tule yllätyksenä ja niihin on helpompi puuttua ajoissa
- Lisää aiheesta:
  - <http://xprogramming.com/articles/bigvisiblecharts/>
  - <http://blog.mountaingoatsoftware.com/the-ideal-agile-workspace>
- Usein toki käytetään myös elektronisia vastineita taskboardista, erityisesti jos kyseessä on hajautettu tiimi, esim:
  - Edellisen sivun tyyliin google docs tai excel
  - Asana, Trello, Pivotal tracker
  - issueträkkit (esim. trac, bugzilla)
  - [http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison\\_of\\_issue\\_tracking\\_systems](http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_issue_tracking_systems)

# Sprint review ja retrospektiivi

- Kuten luennoilla 2 mainittiin pidetään sprintin lopussa sprint review eli katselointi ja sprintin retrospektiivi
- Katselmoinnissa arvioidaan kehitystiimin tekemää työtä
  - Kesken jäneet tai epäkelvostit toteutetut User storyt siirretään takaisin backlogiin
- Retrospektiivissä taas tiimi itse tarkastelee omaa toimintatapaansa ja identifioi mahdollisia kehityskohteita seuraavaan sprinttiin
- Sprintin aikana on product backlogiin tullut ehkä uusia User storyja tai jo olemassaolevia storyjä on muutettu ja uudelleenpriorisoitu
- On suositeltavaa että kehitystiimi käyttää pienen määrän aikaa sprintin aikana product backlogin vaatimiin toimiin, esim. uusien User storyjen estimointiin
- Jos product backlog on hyvässä kunnossa (DEEP) sprintin loppuessa, on jälleen helppo lähteä sprintin suunnitteluun ja uuteen sprinttiin
